



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
2020 - "Año del General Manuel Belgrano"



Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 18 de Agosto de 2020.-

Expte: 02001-0049096-5

Ref.: Nota 29909 de la Cámara de Diputados, sobre construcción de viviendas en el barrio San Francisco de Reconquista.-

Atento a las constancias de autos y habiéndose impuesto del contenido, pase a la **Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda**, para su conocimiento y fines que estime corresponder.-

Sirva la presente de atenta nota.

ANDRÉS DENTESANO
Secretario Privado
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
Provincia de Santa Fe

Secretaría Privada

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar

Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat



**PROVINCIA
DE SANTA FE**

PROVIDENCIA S. H. U.y V.

Ref. Expte N° 02001-0049096-5 – CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROV. DE SANTA FE.-----

**Al Director Provincial de Vivienda y Urbanismo
Ing. José Manuel Kerz
M.I.S.P.Y.H.
Provincia de Santa Fe**

Visto el expediente de la referencia y atento a la aprobación de la Comunicación N° 38562 CD, por así corresponder, se remiten los presentes para su conocimiento y fines pertinentes.

**Sin otro particular, sirviendo la presente como atenta nota de remisión,
saludo muy atentamente.**

SANTA FE, 26 de Agosto de 2020.-

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA.-

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT.



Prof. AMADO ABEL ZORZON
SECRETARIO DE HÁBITAT,
URBANISMO Y VIVIENDA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

PROVIDENCIA S. H. U. y V.

Ref. MEMO GOB. N° 1855

COMUNIDAD NAINIC – RECONQUISTA.-----

Al Director Provincial de Vivienda y Urbanismo

Ing. José Manuel Kerz

M.I.S.P.Y.H.

Provincia de Santa Fe


Visto el memo de la referencia, remitido por la Secretaría Privada de Gobernación mediante correo electrónico de fecha 24.08.2020, se derivan los presentes para su conocimiento y fines que estime corresponder.

Sin otro particular, sirviendo la presente como atenta nota de remisión, saludo muy atentamente.

SANTA FE, 24 de Agosto de 2020.-

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA.- M.I.S.P.Y.H.

SECRETARÍA PRIVADA	
D.F.V. y U.	
RECIBIDO	FECHA
HORS.	31 AGO 2020



Prof. AMADO ABEL ZORZÓN
SECRETARIO DE HÁBITAT,
URBANISMO Y VIVIENDA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

NOTA N° 1855



Reconquista 21 de agosto de 2020

Al Sr Gobernador de
la Provincia de Santa Fe
Cdor. Omar Pertotti

Ref: Proyecto de 14 viviendas de la comunidad Nainic de barrio San Francisco de Asís, Reconquista

Los integrantes de la comunidad Nainic que vivimos en Reconquista, nos dirigimos a usted para pedirle encarecidamente si puede ocuparse de nuestra situación con respecto a un proyecto de viviendas provincial iniciado en el año 2011 para beneficiar a catorce (14) familias de nuestra comunidad. Hasta el día de hoy no podemos concluir con tal proyecto, y lamentablemente, no está concluido ni el 50% del mismo.

Le pedimos, le reclamamos, le solicitamos una respuesta y pronta solución o intervención para poder terminar con esta necesidad, que en tiempos de pandemia y de intensos fríos, es urgente.

Esperamos poder contar con su intervención.

Comunidad Nainic
Barrio San Francisco de Asís
Reconquista

Antonio Fernández
Dirigente
Antonio Fernández
Presidente
Comunidad Nainic

Abel Vázquez
Dirigente
Abel Vázquez




PROVIDENCIA Nro. 71.656 D.P.

Ref.: Expte. Nro. 02001-0049096-5; Cámara de Diputados de la Provincia s/ nota nº 29909 construcción de viviendas en el Barrio San Francisco de Reconquista.-.....

Atento la Comunicación Nº 38562 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe (fs. 2), derívense las presentes actuaciones a intervención de la **DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN.**

DIRECCIÓN PROVINCIAL,
vi

22 OCT 2020



Ing. José Manuel Kerz
DIRECTOR PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

REF.: Exp. 02001-0049096-5
Cámara de Diputados
s/Reconquista B° San Francisco

A la
**Subdirección Gral. de
CONSTRUCCIONES:**

Atento a lo solicitado mediante PROVIDENCIA N°71.656 D.P., se derivan las presentes actuaciones para informar el estado de la Obra "Construcción de 14 viviendas en Barrio San Francisco" en la localidad de Reconquista - Dpto. Gral.Obligado.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
Santa Fe "Cuna de la Constitución Nacional", 23 de Octubre de 2020.


ARQ. OSCAR R. SIMÓN
Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V y U
M.I.S.P.y H.

Arq. Isidoro...
PASE A SUS EFECTOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
D.P.V. y U. - S.E.H.

26 OCT 2020

"2020 año del General Manuel Belgrano"

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
San Luis 3153 - 13000 Santa Fe - Tel. 3412141 - 3412726

ARQ. MARIANO G. BARALDI
Subdirección Gral. de Construcciones
D.P.V. y U. - M.I.S.P. y H.



Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

**PROVINCIA
DE SANTA FE**

Ref.: Expediente N° 02001-0049096-5

Srta. Supervisora
arq. Laura R. Fantin

En consideración a lo solicitado en el expediente de referencia, se informa que la obra "Terminación 14 viv. NB 2D e infraestructura" plan MB 166, Reconquista, que está construyendo la Fundación Progresar Avellaneda, tuvo que suspender las actividades debido al atraso en el pago de certificados de obra emitidos.

Durante los meses de febrero y parte de marzo del corriente año se realizaron tareas menores, las cuales no se midieron para confeccionar certificados de obra dado su escaso volumen, y la contratista de esa manera con mínimo personal mantuvo presencia física en la obra en custodia de materiales y herramientas, hasta que tuvieron que retirarse por el Decreto de Aislamiento preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de coronavirus.

Esta Inspección deja constancia que la contratista ha mantenido una comunicación permanente a la espera de poder percibir sus haberes hecho que comenzó a fin del mes pasado, de esta manera la Contratista ha reiniciado las tareas y solicitará una ampliación de plazo de obra para la finalización de los trabajos.

Siendo todo para informar, para su conocimiento y prosecución del trámite se eleva.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2020



Arq. CARLOS D. ILCHISCHEN
Inspector de Obra
D.P.V. y U.

"2020 año del General Manuel Belgrano"

Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda


Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo - San Luis 3153 - (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4815676 / 70
Dirección Provincial



PROVINCIA DE SANTA FE
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo

Archivo

1-020 6011-7



PROVINCIA DE SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

OBRA: "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD NAINIC - B° SAN FRANCISCO DE ASIS "

LOCALIDAD: **RECONQUISTA** DEPARTAMENTO: GRAL. OBLIGADO PLAN N°: **MB 166 (ex 20.020)**

EMPRESA CONTRATISTA: **FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA**

CERTIFICADO DE OBRA NRO. **8**

TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL MES **enero-20**

INFORMACION DE LA OBRA	
FECHA INICIO SEGUN CONTRATO	01-jun-2019
PLAZO EJECUCION S/CONTRATO:	12 meses
FECHA TERMINACION S/CONTRATO:	31-may-2020
AMPLIACION DE PLAZO	
FECHA de TERMINACION de AMPLIACION DE PLAZOS	
LICITACION PUBLICA Nro:	
ADJUDICADA POR RESOLUCION Nro:	1198/19
EXPEDIENTE PRINCIPAL Nro.:	15201-0190721-7
OBRA FINANCIADA CON RECURSOS DEL FO.PRO VI.	

COPIA NO NEGOCIABLE
SIN AUTORIZACION EXPRESA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO

RESUMEN GENERAL DE IMPORTES			
CONCEPTO	Por trabajos ejecutados en el Periodo	Por Ajustes s/Certificados Anteriores	Totales
VIVIENDAS NB (2D)	\$ 649.238,37	\$ 66.029,42	\$ 715.267,79
INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Subtotal (1) Importes certificados	\$ 649.238,37	\$ 66.029,42	\$ 715.267,79
Deducciones:			
Por Anticipos Financieros			\$ 162.309,59
Por AJUSTE de Anticipos Financieros Cert. N° 6 - 7 (viviendas)			\$ 16.507,36
Deducción Fondos de Reparos (5% sobre subtot.1)			\$ 35.763,39
Deducción Garantia de Ejecucion de contrato (5% sobre subtot.1)			\$ 35.763,39
SubTotal (2) Deducciones			\$ 250.343,73
SubTotal (3) Devolucion Multas			\$ 0,00
Total (1-2+3)			\$ 464.924,06
TOTAL NETO A PAGAR:			\$ 464.924,06
Total Neto: Pesos cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos veinticuatro con seis Centavos----			

Santa Fe, 20-febrero-2020

GLORIA MARCHETTI
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

RECIBIDO
03 MAR 2020
Meses de Entradas
D.P.V.U.
PROCESO CERTIFICACIONES

INSPECTOR DE OBRAS
ARG. CARLOS ILGHISCHEN
D.P.V.U.

ANTONIO KOUEFATI
Certificaciones
D.P.V.U. - S.E.H.

SUPERVISOR DE OBRAS
ARG. LAURA FANTIN
D.P.V.U.

PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA: "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD NAINIC - B° SAN FRANCISCO DE ASIS"
 DEPARTAMENTO: GRAL. OBLIGADO
 LOCALIDAD: RECONQUISTA
 EMPRESA CONTRATISTA: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

PLAN N°: MB 166 (ex 20.020)

CERTIFICADO NRO. 8
 Trabajos Ejec. en el Periodo enero 20


RESUMEN DE MONTOS CERTIFICADOS

N°	MES/AÑO	POR TRABAJOS EJECUTADOS			ACUMUL TOTAL
		VIVIENDAS NB (2D)	INFRAEST.	ACUM. TOTAL	
1	jun-19	\$ 5 023 243,19	\$ 1 122 356,34	\$ 6 145 599,53	\$ 0,00
2	jul-19	\$ 202 075,03	\$ 0,00	\$ 6 347 674,56	\$ 0,00
3	ago-19	\$ 4 607 057,45	\$ 0,00	\$ 10 954 732,01	\$ 0,00
4	sep-19	\$ 1 293 605,68	\$ 233 225,65	\$ 12 481 563,34	\$ 0,00
5	oct-19	\$ 2 758 261,80	\$ 0,00	\$ 15 239 825,14	\$ 23 123,94
6	nov-19	\$ 811 128,67	\$ 555 225,65	\$ 16 606 179,46	\$ 0,00
7	dic-19	\$ 561 525,67	\$ 0,00	\$ 17 167 705,13	\$ 3 866,81
8	ene-20	\$ 143 749,37	\$ 0,00	\$ 17 311 454,50	\$ 0,00
		\$ 649 238,37	\$ 0,00	\$ 17 960 692,87	\$ 66 029,42

DEDUCCIONES

N°	MES/AÑO	Deducción Anticipos Financieros			POR AJUSTES DE DEDUCCIONES S/ CERTIF. EMITIDOS			FONDO REPARO		OBSERVACIONES
		VIVIENDAS NB (2D)	INFRAEST.	ACUMUL TOTAL	VIVIENDAS NB (2D)	INFRAEST.	ACUMUL TOTAL	Del Mes	ACUM.	
		\$ 50 518,75	\$ 0,00	\$ 50 518,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10 103,75	\$ 10 103,75	TANT FIN ENTREGADO
		\$ 1 151 764,35	\$ 0,00	\$ 1 202 283,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230 352,87	\$ 240 456,62	
		\$ 323 401,42	\$ 58 306,41	\$ 1 583 990,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76 341,57	\$ 316 798,19	AJUSTES CERT 23 VIV 13 INFRA
		\$ 689 565,45	\$ 0,00	\$ 2 273 556,40	\$ 149 354,47	\$ 5 780,99	\$ 155 135,46	\$ 168 940,18	\$ 485 738,37	AJUSTES CERT 4 VIV
		\$ 202 782,17	\$ 138 806,41	\$ 2 615 144,98	\$ 5/ 122,99	\$ 0,00	\$ 212 258,45	\$ 79 742,31	\$ 565 480,68	AJUSTES CERT 5 INFRA POR DIFERENCIA INDICES
		\$ 140 381,42	\$ 0,00	\$ 2 755 526,40	\$ 0,00	\$ 966,71	\$ 213 225,16	\$ 28 269,62	\$ 593 750,30	AJUSTES CERT 5 INFRA POR DIFERENCIA INDICES
		\$ 35 937,34	\$ 0,00	\$ 2 791 463,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213 225,16	\$ 7 187,47	\$ 600 937,77	AJUSTES CERT N° 6 - 7 VIVIEN
		\$ 162 309,59	\$ 0,00	\$ 2 953 773,33	\$ 16 507,36	\$ 0,00	\$ 229 732,52	\$ 35 763,39	\$ 636 701,16	

ACUMUL ACTUAL	ACUMUL ANTERIOR	MENSUAL	VIVIENDAS NB (2D)	INFRAEST.	ACUMUL TOTAL	VIVIENDAS NB (2D)	INFRAEST.	ACUMUL TOTAL	VIVIENDAS NB (2D)	INFRAEST.	ACUMUL TOTAL	Del Mes	ACUM.	Desembolso Total al Certificado Actual
\$ 15 049 885,23	\$ 15 400 646,96	\$ 649 238,37	\$ 891 939,25	\$ 26 990,75	\$ 918 930,00	\$ 2 756 650,51	\$ 197 112,82	\$ 2 953 773,33	\$ 222 984,82	\$ 6 747,70	\$ 229 732,52	\$ 636 701,16	\$ 600 937,77	\$ 15 696 117,02
\$ 1 910 807,64	\$ 1 910 807,64	\$ 0,00	\$ 825 909,83	\$ 26 990,75	\$ 852 900,58	\$ 2 594 350,92	\$ 197 112,82	\$ 2 791 463,74	\$ 208 477,46	\$ 6 747,70	\$ 213 225,16	\$ 600 937,77	\$ 35 763,39	
			\$ 66 029,42	\$ 0,00	\$ 66 029,42	\$ 162 309,59	\$ 0,00	\$ 162 309,59	\$ 16 507,36	\$ 0,00	\$ 16 507,36	\$ 35 763,39		



INSPECTOR DE OBRAS
 ARQ. CARLOS ILCHISCHEN
 D.P.V.U.

GLORIA MARCHETTI
 EMPRESA CONTRATISTA
 MAR 1/20
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA



PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD NAINIC - B° SAN FRANCISCO DE ASIS"
 LOCALIDAD: RECONQUISTA DEPARTAMENTO: GRAL. OBLIGADO
 EMPRESA CONTRATISTA: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA
 PLAN N° MB 166 (ex 20.020)

CERTIFICADO NRO. 8
 TRABAJOS EJEC. EN EL PERIODO enero 20

MONTOS DE CONTRATO

MES BASE:	mar-19	VIVIENDAS NB (2D)	INFRAESTRUCTURA
14 VIVIENDAS NB (2D)		\$ 20.092.972,77	\$ 4.489.425,37
MONTO TOTAL		\$ 24.582.398,14	

ANTICIPOS FINANCIEROS

NRO.	FECHA DE PAGO	Resol./Expte. Nro.	IMPORTE ANTICIPOS	IMPORTE TOTALES QUE SE CONSIDERAN	% EJEC. DE OBRA	MONTO s/EL QUE SE CALCULA	% A DEDUCIR POR ANTIC. FINANC.	Concepto del Anticipo	Fuente Financ.	Estado
1º	23-may-19		\$ 5.023.243,19		0,000	\$ 20.092.972,77	25,0000	VIVIENDAS NB (2D)	Fdos FoProVi	DEF
1º	23-may-19		\$ 1.122.356,34		0,000	\$ 4.489.425,37	25,0000	INFRAESTRUCTURA	Fdos FoProVi	DEF
			\$ 6.145.599,53							

(*) PROV = Provisorio DEF=Definitivo

MONTOS TOTALES DE CONTRATO REDETERMINADOS

Coef. Resumen VIV 1,4520

Coef. Resumen INF 1,3915

VIVIENDAS NB (2D)		
MES INDICES VIGENTES	MONTO REDETERMINADO	FR PROM
jun-19	\$ 22.326.149,40	1,1111
ago-19	\$ 24.947.826,20	1,2416
oct-19	\$ 26.981.895,53	1,3429

INFRAESTRUCTURA		
MES INDICES VIGENTES	MONTO REDETERMINADO	FR PROM
jun-19	\$ 4.906.118,44	1,0928
ago-19	\$ 5.612.194,77	1,2501

MONTOS CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA					
VIVIENDAS NB (2D)					
MONTO VIGENTE VIVIENDAS	% OBRA COMPROMETIDO	% OBRA EJECUTADO ACUMULADO	% OBRA A CERTIFICAR con IND VIGENTES	IMPORTE CERTIFICADO VIVIENDAS	DEDUCCION ANT. FINANC (25,00%)
oct-19					
\$ 26.981.895,53	50,330	51,1244	2,4062	\$ 649.238,37	\$ 162.309,59

INFRAESTRUCTURA					
MONTO VIGENTE INFRAESTRUCTURA	% OBRA COMPROMETIDO	% OBRA EJECUTADO ACUMULADO	% OBRA A CERTIFICAR con IND VIGENTES	IMPORTE CERTIFICADO INFRAESTRUCTURA	DEDUCCION ANT. FINANC (25,00%)
ago-19					
\$ 5.612.194,77	34,520	15,0311	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

EMPRESA CONTRATISTA
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA
GLORIA MARCHETTI
 ARQUITETA
 Mat. 1718

INSPECTOR DE OBRAS
 ARQ. CARLOS ILCHISCHEN
 DPVU


SUPERVISOR DE OBRAS
 ARQ. LAURA FANTIN
 DPVU

PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA: "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB . 2D e INFRAESTRUCTURA . COMUNIDAD NAINIC - B' SAN FRANCISCO DE ASIS"
 LOCALIDAD: RECONQUISTA Dpto: GRAL. OBLIGADO PLAN N°: MB 166 (ex 20.020)
 ENTE EJECUTOR: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

CERTIFICADO No. 8 enero 20
 TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO

PLANILLA DE AVANCES MENSUALES CON INCIDENCIAS VIGENTES
 VIVIENDAS NB (2D)

ITEM	DESIGNACION	Certificado Nro. 8			Certificado Nro. 7			Certificado Nro. 6			Certificado Nro.		
		% Avance del Mes ene-20	% INCID oct-19	Av Redet DEL ITEM s/ del TOTAL	% Avance del Mes dic-19	% INCID oct-19	Av Redet DEL ITEM s/ del TOTAL	% Avance del Mes nov-19	% INCID oct-19	Av Redet DEL ITEM s/ del TOTAL	% Avance del Mes	% INCID	Av Redet DEL ITEM s/ del TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	0,00	1,1590	0,0000	0,00	1,1590	0,0000	0,00	1,1590	0,0000			
2	FUNDACIONES	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000			
3	AISLACION HIDROFUGA	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000			
4	MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES	0,00	6,8132	0,0000	0,00	6,8132	0,0000	0,00	6,8132	0,0000			
5	REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO	0,00	0,6370	0,0000	0,00	0,6370	0,0000	1,63	0,6370	0,0104			
6	REVOQUES	4,35	21,2907	0,9281	2,69	21,2907	0,5727	2,57	21,2907	0,5472			
7	CONTRAPISO	0,84	7,3221	0,0615	0,00	7,3221	0,0000	4,87	7,3221	0,3566			
8	PISO	21,32	0,2028	0,0432	0,00	0,2028	0,0000	48,67	0,2028	0,0987			
9	CUBIERTA	0,00	14,4567	0,0000	0,00	14,4567	0,0000	4,05	14,4567	0,5855			
10	CIELORRASO	0,00	2,6694	0,0000	0,00	2,6694	0,0000	0,00	2,6694	0,0000			
11	REVESTIMIENTO	0,00	1,3449	0,0000	0,00	1,3449	0,0000	0,00	1,3449	0,0000			
12	PINTURA	0,00	6,1107	0,0000	0,00	6,1107	0,0000	0,00	6,1107	0,0000			
13	VIDRIOS	0,00	0,2301	0,0000	0,00	0,2301	0,0000	0,00	0,2301	0,0000			
14	CARPINTERIA	0,00	16,3918	0,0000	0,00	16,3918	0,0000	0,00	16,3918	0,0000			
15	INSTALACION DE GAS	0,00	1,5183	0,0000	0,00	1,5183	0,0000	0,00	1,5183	0,0000			
16	INSTALACION SANITARIA	12,28	11,0900	1,3619	0,00	11,0900	0,0000	5,44	11,0900	0,6033			
17	INSTALACION ELECTRICA	0,00	4,9141	0,0000	0,00	4,9141	0,0000	0,00	4,9141	0,0000			
18	MESADAS DE COCINA	0,00	0,2925	0,0000	0,00	0,2925	0,0000	0,00	0,2925	0,0000			
19	CERCOS	0,00	1,2296	0,0000	0,00	1,2296	0,0000	0,00	1,2296	0,0000			
20	LIMPIEZA FINAL	0,00	0,3747	0,0000	0,00	0,3747	0,0000	0,00	0,3747	0,0000			
21	HONORARIOS PROF CONDUCCION Y MENSURA	0,69	1,9524	0,0135	0,45	1,9524	0,0088	3,86	1,9524	0,0754			
			100,0000	2,4062		100,0000	0,5815		100,0000	2,2771			
			Adoptado:	2,4062		Adoptado:	0,5815		Adoptado:	2,2771			
													Adoptado:
													0,0000
													0,0000


 EMPRESA CONTRATISTA
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA
 FLORENCIA MARCHETTI
 ARQUITECTA
 Mbl. 1726


 INSPECTOR DE OBRAS
 ARQ CARLOS ILCHISCHEN
 DPV y U


 SUPERVISOR DE OBRAS
 ARQ LAURA FANTIN
 DPV y U

PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA: "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD NAINIC - B° SAN FRANCISCO DE ASIS"
 LOCALIDAD: RECONQUISTA Dpto: GRAL. OBLIGADO
 EMPRESA CONTRATISTA: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA
PLAN N°: MB 166 (ex 20.020)

CERTIFICADO Nro. 8
 TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO **enero 20**

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
 VIVIENDAS NB (2D)

ITEM	DESIGNACION	PORCENTAJE DEL ITEM ACUMULADO AL CERTIFICADO N° 8												% AVANCES FISICOS S/EL TOTAL S/ CONTRATO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DEL MES ACTUAL		ACUMULADO DEL ITEM S/EL TOTAL (5)=1 x %acum	
		jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	% Avance del item (2)	DEL ITEM S/EL TOTAL (4)=2 x 1		
1	TRABAJOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
2	FUNDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
3	ASLACION HIDROFUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
4	MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES	4,33	89,90	89,99	96,32	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	7,3293	7,3293
5	REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO	4,33	89,99	89,99	92,86	98,36	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,5399	0,5399
6	REVOQUES	0,00	0,00	16,18	69,46	82,29	84,86	87,55	91,90	98,57	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	0,9322	0,9322
7	CONTRAPISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0640	0,0640
8	PISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2100	0,2100
9	CUBIERTA	4,78	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	0,0448	0,0448
10	CIELORRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
11	REVESTIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12	PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
13	VIDRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
14	CARPINTERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15	INSTALACION DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
16	INSTALACION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
17	INSTALACION ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
18	MESADAS DE COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
19	CERCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
20	LIMPIEZA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
21	HONORARIOS PROF. CONDUCCION Y MENSURA	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	23,86	24,31	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,69	0,0155	0,5500
														100,0000	2,4061	51,1244	
														% Acumulado Adoptado:		51,1244	

% DE AVANCE s/INCIDENCIAS CONTRACTUALES	
% Av FISICO ACUMULADO	51,1244
% Av FISICO ANTERIOR	48,7183
% MENSUAL	2,4061

GLORIA MARCHETTI
 ARQUILETA
 EMPRESA CONTRATISTA
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

INSPECTOR DE OBRAS
 ARO CARLOS ILCHISCHEN
 DPV y U

SUPERVISOR DE OBRAS
 ARO LAURA FANTIN
 DPV y U

PROVINCIA DE SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

"TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD N° 16 - B. SAN FRANCISCO DE ASIS -"

OBRA

RECONQUISTA

Dpto. GRAL OBLIGADO

PLAN N°: MB 166 (ex 20.020)

EMPRESA CONTRATISTA

FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

CERTIFICADO N°

8

TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO


enero 20

VIVIENDAS NB (2D)

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% AV REAL DEL PERIODO	1,006	22,929	6,438	12,160	3,295	2,281	5,586	2,466	0,000	0,000	0,000	0,000
% REAL ACUMULADO	1,006	23,934	30,372	42,553	45,851	48,132	49,718	51,724				
% CONTRACTUAL ACUMULADO	1,350	3,370	5,390	7,570	9,550	30,490	40,520	50,330	72,790	87,970	99,010	100,000
% CONTRACTUAL DEL MES	1,350	2,020	2,020	2,180	10,950	11,970	10,030	9,840	22,450	15,190	11,040	0,990
% DIFERENCIA ACUMULADA	-0,344	-20,564	-24,982	-34,983	-27,331	-17,642	-8,198	-0,734	0,000	0,000	0,000	0,000

CURVA DE INVERSIONES SEGUN PLAN DE TRABAJOS

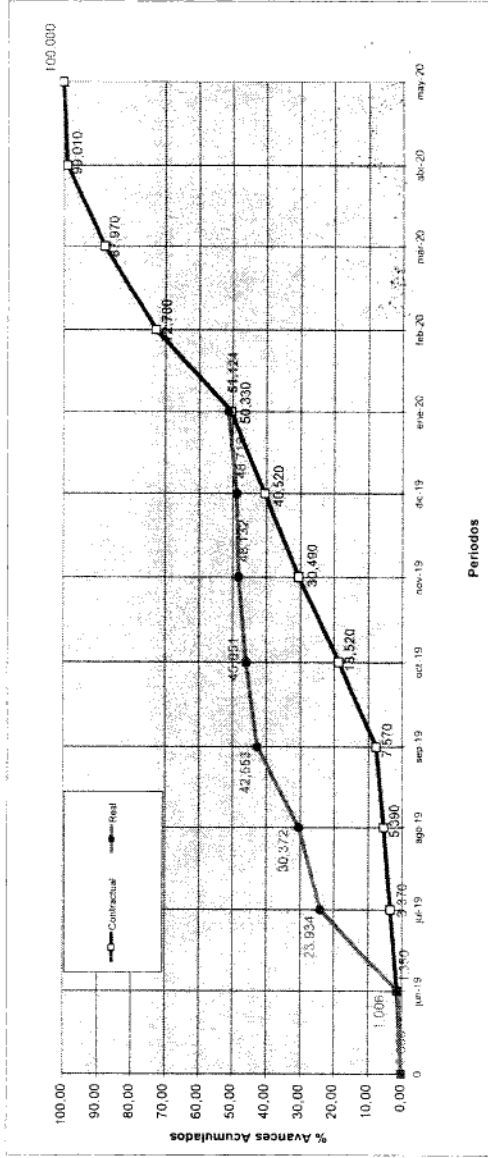

FLORIA MARCHETTI
ARQUITECTA
MBA 17.26
EMPRESA CONTRATISTA
FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

INSPECTOR DE OBRAS
ARG. CARLOS LICHTENH
D.F.V.U.

SUPERVISOR DE OBRAS
ARG. LAURA FANTIN
D.F.V.U.





PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA: "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD NAINIC - B° SAN FRANCISCO DE ASIS"
 LOCALIDAD: RECONQUISTA
 ENTE EJECUTOR: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA
 PLAN N°: MB 166 (ex 20.020)
 Dpto: GRAL. OBLIGADO

CERTIFICADO No. 8
 TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO enero 20

PLANILLA DE AVANCES MENSUALES CON INCIDENCIAS VIGENTES INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESIGNACION	Certificado Nro. 8		Certificado Nro.		Certificado Nro.	
		% Avance del Mes ene-20	% INCID ago-19	% Avance del Mes	% INCID	% Avance del Mes	% INCID
1	PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	38,2208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	7,8617	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	RED DE AGUA	0,00	16,1843	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	RED VIAL DE CONJUNTO	0,00	8,4747	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	DESAGUES PLUVIALES	0,00	13,7753	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	VEREDAS PEATONALES	0,00	8,9229	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	ARBORIZACION Y ESPACIOS VERDES	0,00	0,6247	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	5,9555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		Adoptado: 100,0000		Adoptado: 0,0000		Adoptado: 0,0000	
		Adoptado: 0,0000		Adoptado: 0,0000		Adoptado: 0,0000	


 EMPRESA CONTRATISTA
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA
 GLORIA MARCHETTI
 ARQUITECTA
 M.B. 1.123


 INSPECTOR DE OBRAS
 ARQ. CARLOS ILCHISCHEN
 DPV y U


 SUPERVISOR DE OBRAS
 ARQ. LAURA FANTIN
 DPV y U



PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA: "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD NAINIC - B° SAN FRANCISCO DE ASIS "
 LOCALIDAD: RECONQUISTA Dpto: GRAL. OBLIGADO PLAN N°: MB 166 (ex 20.020)
 EMPRESA CONTRATISTA: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

CERTIFICADO Nro. 8
 TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO **enero 20**

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESIGNACION	PORCENTAJE DEL ITEM ACUMULADO AL CERTIFICADO N° 8											% AVANCES FISICOS S/EL TOTAL SI CONTRATO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	DEL MES ACTUAL		ACUMULADO DEL ITEM s/EL TOTAL (5)=1 x %acum	
		jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	% Avance del item (2)	DEL ITEM s/EL TOTAL (4)=2 x 1		
1	PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
2	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
3	RED DE AGUA	0,00	0,00	32,55	94,18	94,18	94,18	94,18	94,18	94,18	94,18	94,18	94,18	94,18	0,0000	15,0311
4	RED VIAL DE CONJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
5	DESAGUES PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6	VEREDAS PEATONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
7	ARBORIZACION Y ESPACIOS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
8	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
													100,0000	0,0000	15,0311	
													% Acumulado Adoptado:		15,0311	

% DE AVANCE s/INCIDENCIAS CONTRACTUALES	
% Av. FISICO ACUMULADO	15,0311
% Av. FISICO ANTERIOR	15,0311
% MENSUAL	0,0000

[Signature]
 INSPECTOR DE OBRAS
 ARQ. CARLOS ILCHSCHEN
 DPV y U

EMPRESA CONTRATISTA
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA
 GLORIA MARCHETTI
 ARQUITECTA
 EPPA 17.000

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRAS
 ARQ. LAURA FANTIN
 DPV y U



PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NIB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD MAINIC - B" SAN FRANCISCO DE ASIS"
 LOCALIDAD: RECONQUISTA Dpto: GRAL. OBLIGADO PLAN N°: MB 166 (ex 20.020)
 EMPRESA CONTRATISTA: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA


CERTIFICADO No. 8
 TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO enero 20

INFRAESTRUCTURA

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

MESES	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20
% AV REAL DEL PERIODO	0,000	0,000	5,195	0,000	9,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
% REAL ACUMULADO	0,000	0,000	5,195	5,195	15,031	15,031	15,031	15,031	15,031	15,031	15,031	15,031
% CONTRACTUAL ACUMULADO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,950	34,520	54,520	79,190	100,000
% CONTRACTUAL DEL MES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,950	19,570	20,000	24,670	20,810
% DIFERENCIA ACUMULADA	0,000	0,000	5,195	5,195	15,031	15,031	15,031	0,081	-19,489	0,000	0,000	0,000

CURVA DE INVERSIONES SEGUN PLAN DE TRABAJOS

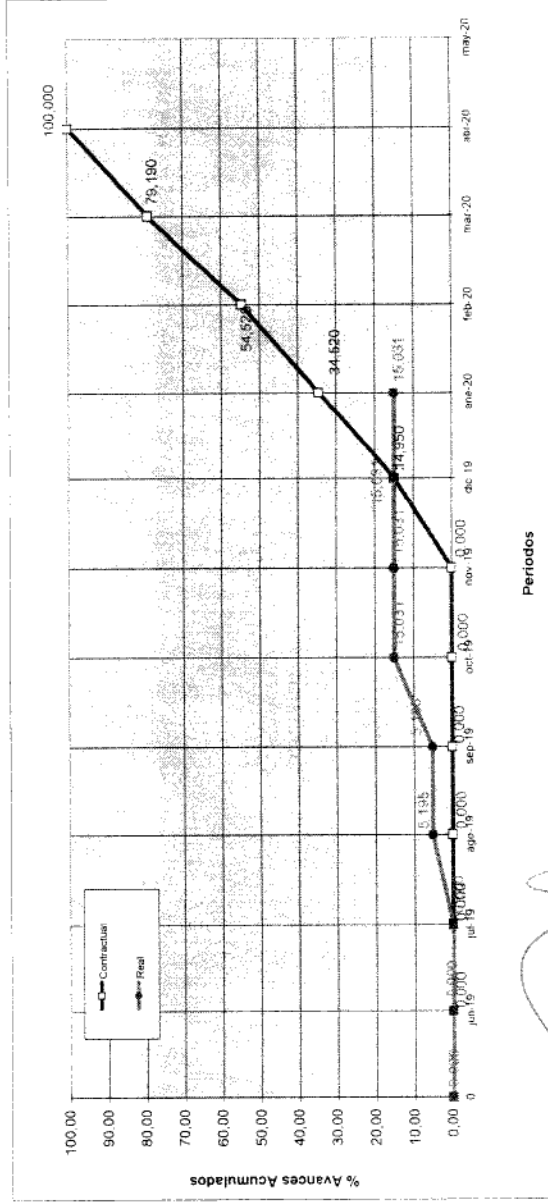

GLORIA MARCHETTI
 ARQUITECTA
 EMPRESA CONTRATISTA
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

INSPECTOR DE OBRAS
 ARO CARLOS HILSCHEN
 O.P.V.Y.U.


SUPERVISOR DE OBRAS
 ARO LAURA FANTIN
 O.P.V.Y.U.



PROVINCIA DE SANTA FE
 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OBRA "TERMINACION de 14 VIVIENDAS NB - 2D e INFRAESTRUCTURA - COMUNIDAD NAINIC - B" SAN FRANCISCO DE ASI
 LOCALIDAD: RECONQUISTA
 EMPRESA CONTRATISTA: FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA

Pag. 10

PLAN N° MB 166 (ex 20.020)



CERTIFICADO DE OBRA NRO. 15
 TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO ene-20

AJUSTE CERTIFICADOS N°: 6 - 7


MONTO CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA - 14 VIVIENDAS NB - 2D								
VALORES VIGENTES		% OBRA EJECUT	% AVANCE MENSUAL (CURVA)	% OBRA A CERTIFICAR	% DE PROPORCIONALIDAD	AVANCE MENSUAL INCID. VIGENTES	IMPORTE	OBSERVACIONES
MONTO	FECHA							
\$ 26.981.895,53	oct-19	48,1318	2,2806	2,2806	100,00	2,2771	\$ 614.404,74	certificado N° 6
\$ 26.981.895,53	oct-19	48,7183	0,586	0,586	100,00	0,5815	\$ 156.899,72	certificado N° 7

TOTAL **\$ 771.304,46**

CERTIFICADO	LIQUIDADO	DEDUC. ANT. FINAN. EFECTUADA	AJUSTADO	DEDUC. ANT. FINAN. REDET	AJUSTE OBRA	AJUSTE DEDUCCION
N° 6	\$ 561.525,67	\$ 140.381,42	\$ 614.404,74	\$ 153.601,19	\$ 52.879,07	\$ 13.219,77
N° 7	\$ 143.749,37	\$ 35.937,34	\$ 156.899,72	\$ 39.224,93	\$ 13.150,35	\$ 3.287,59
14 VIVIENDAS NB - 2D					\$ 66.029,42	\$ 16.507,36


 GLORIA MARCHETTI
 ARQUITECTA
 Mat. 1726
 EMPRESA CONTRATISTA
 FUNDACION PROGRESAR AVELLANEDA


 INSPECTOR DE OBRAS
 D.P.V.U.
 Arq. CARLOS D. ILCHISCHEN
 Inspector de Obra
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat


 SUPERVISOR DE OBRAS
 D.P.V.U.



Ref. Exp N° 02001-0049095-5

Subdirección de Construcciones

Arq Mariano Baraldi

Atento a lo solicitado en la Providencia N°71656DP, fj. 8, como lo informa el inspector a fj 10, la obra terminación 14 viviendas NB-2Dormitorios, mejoramiento Barrial 166, Reconquista, Dpto Gral Obligado , Exp Ppal. 15201-0190721-7, Reconquista, Dpto Gral Obligado, que tiene como destinatarios a Comunidad Nainic, Barrio San Francisco de Asis, se encuentra en ejecución por la Fundación Progresar de la ciudad de Avellaneda.


La obra de terminación se inició en junio de 2019 y la fecha de culminación 31 de mayo de 2020, con un pedido de ampliación contractual tramitado por nota 1434/2020.-

El último certificado de obra se emitió en el mes de enero 2020 (adjunto fs11 a 20) donde alcanza un avance físico del 51,12 % en el rubro vivienda y un 15,33% en rubro infraestructura.

Los trabajos fueron suspendidos por la Fundación en el mes de marzo, en el marco de la pandemia Covid-19, y por la falta de pago de certificados ,que se acordaron con la Consolidación de la deuda; y retomados en el mes de noviembre del corriente.

Se eleva para su conocimiento y prosecución del trámite.

Supervisión de obras, 02 de diciembre de 2020.-


Arq. LAURA FANTIN
Inspectora de Obras
DPV y U -
de firmarse


Ref.: Exp. 02001-00499096-5
Cámara de Diputados de la Provincia
RECONQUISTA, B° San Francisco
S/construcción de viviendas

Sr. DIRECTOR PROVINCIAL:

Cumplimentando lo solicitado a fs. N° 8 mediante PROVIDENCIA N°71.656 D.P., se dio intervención a la Subdirección de Construcciones que elabora informe de competencia de fs. N° 10 a 21.

A su conocimiento y consideración se elevan las presentes actuaciones para continuidad del trámite.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
SANTA FE "Cuna de la Constitución Nacional", 10 de Diciembre de 2020.



Arq. OSCAR R. SIMÓN
Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
M.I.S.P. y H.



PROVIDENCIA Nro. 72.127 D.P.

Ref.: Expte. Nro. 02001-0049096-5; Cámara de Diputados de la Provincia s/ comunicación nº 38562 CD - construcción de viviendas en el Barrio San Francisco de Reconquista.-.....

Atento la Comunicación Nº 38562 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe (fs. 2), y con informe de competencia de las áreas pertinentes, vuelvan los actuados a la **SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA** a su efecto.

Sirva la presente como formal carta de remisión.

DIRECCIÓN PROVINCIAL, 28 DIC 2020

hls

Ing. José Manuel Kerz
DIRECTOR PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda
Ministerio de Infraestructura
Servicios Públicos y Hábitat



Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

**PROVINCIA
DE SANTA FE**


PROVIDENCIA S. H. U.y V.
Ref. Expediente 02001-0049096-5
Camara de Diputados. NOTA N° 29909 -
Const. De Viv. en el B° San Francisco de
Reconquista.

ANDRES DENTESANO
SECRETARIA PRIVADA
MYSpyH

S / D

Cumplimentado lo peticionado a foja N° (4), se incorpora el informe de la Subdirección de Construcciones de la D. P. V. y U. de Fs. N° (10 a 21), vuelvan los actuados al M.I.S.P.Y.H, para los fines que estimen corresponder.

Sin otro particular, sirviendo la presente como atenta nota de remisión, saludo muy atentamente.



Prof. AMADO ÁBEL ZORZÓN
Secretario de Hábitat,
Urbanismo y Vivienda
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

SANTA FE, 30 de Diciembre de 2020.-
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA.-
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT.



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Obras Públicas



Corresponde Expte. N° 02001-0049096-5.

*Atento a lo solicitado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a foja 2, y en orden a lo informado por la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, elévense los autos a la **Secretaria Privada de la señora Ministra**, para su conocimiento, sugiriendo su posterior derivación a la señora Ministra del M.I.S.P.yH. a idénticos fines, quien de aprobar lo actuado, dará traslado de los mismos a la Subsecretaría de Asuntos Legislativos (Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad).*

Atentamente.

SANTA FE, 04 de Enero de 2021.

Dra. ADRIANA MARCELA GARCÍA
Subdirectora General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat



Expte: 02001-0049096-5

Ref.: Nota 299090, construcción de viviendas en el barrio San Francisco, de Reconquista

Atento a lo solicitado por la **Honorable Cámara de Diputados** de la provincia de Santa Fe mediante comunicación Nro 24710/20 y habiendo tomando conocimiento de lo informado por la *Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo*, remítanse los presentes autos a la **Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos**

Sirva la presente de atenta nota de remisión


C.P.N. SILVINA FRANA
Ministra
INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
Provincia de Santa Fe

Secretaría Privada

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE
Tel.: 0342 - 457 3570 - e-mail: privmop@santafe.gov.ar



PROVINCIA
DE SANTA FE

NOTA N.º - 19442

Santa Fe 4 de octubre de 2021


Referencia: Expte Nro.02001-0049096-5

Sr. Presidente de la
Cámara de Diputados
Provincia de Santa Fe
Dr. Pablo Farías

S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle la respuesta al
proyecto de comunicación aprobado bajo el **Nº 38.562 CD**

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.


Dra. MARCELA AEBERHARD
Subsecretaria de Asuntos Legislativos
Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos
