



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

CORRESPONDE EXPTE. N° 02001-0050315-5.


Atento a la presentación obrante a fojas 02/03 en la que la Cámara de Diputados de la Provincia mediante Nota N° 25094 – 20 solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe sobre las tareas y gestiones que se estén realizando para evitar la pérdida de inversiones y el deterioro prematuro de las obras viales que estaba realizando la Provincia y que fueron paralizadas por decisión del actual Ejecutivo Provincial, respecto de las Rutas Provinciales 28, 22, 2 – RP 17, 10, 15, 36, 63, 88, 94, 294, 1, 64 y el AP 01, corresponde se eleven las presentes actuaciones al **Secretario Privado del señor Ministro** para su conocimiento, sugiriéndose su posterior remisión a la Dirección Provincial de Vialidad, para su intervención e informe.

Se deja constancia de que la Cámara ha otorgado un plazo para su respuesta, el cual vencerá el día 13/11/2020.

Atentamente.

SANTA FE, 14 de Octubre de 2020.

jm



Dr. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
2020 - "Año del General Manuel Belgrano"



Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 20 de octubre de 2020.-

Expte: 02001-0050315-5

Ref.: Nota 30333 pedido de informe s/ las tareas que se están realizando para evitar la pérdida de inversiones y el deterioro prematuro de las obras viales.-

Atento a las constancias de autos y habiéndose impuesto del contenido, pase a la **Dirección Provincial de Vialidad**, para su conocimiento y fines que estime corresponder.-


Imprimase a las presentes el carácter de **URGENTE DESPACHO**.-

Sirva la presente de atenta nota.

ANDRÉS DENTESANO
Secretario Privado
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
Provincia de Santa Fe

Secretaría Privada

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Corresponde 02001-0050315-5

Ref.: CÁMARA DE DIPUTADOS – NOTA 30333 PEDIDO DE INFORME EN RELACIÓN A TAREAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA EVITARLA PERDIDA DE INVERSIONES Y EL DETERIORO PREMATURO DE OBRAS VIALES

SANTA FE, 27 OCT 2020

Pase a **Ingeniero Jefe** para evaluación e informe del área competente.



SR OSCAR CESCHI
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
MESA GENERAL DE ENTRADAS
27 OCT 2020
Expte. N°:
Recibí original con fs.
Hora:

AGUSTO SANCHEZ
General de Entradas
DPV


“2020 - Año del General Manuel Belgrano”

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional" 09 NOV 2020

Corresponde al Expediente Nº02001-0050315-5

Tomado conocimiento, pasen las presentes actuaciones a la **Dirección General de Obras**, para la intervención de su competencia.

JEFATURA TÉCNICA,



Ing. FEDERICO F. AVALÓ
INGENIERO JEFE
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE

"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 28-5		TRAMO: R.N. Nº 178 - Montes de Oca		SECCIÓN:	OBRA Nº 511
TIPO DE OBRA: Alteo y Obras de Protección de Taludes		TIPO DE OBRA: Alteo y Obras de Protección de Taludes		LONGITUD:	DPTO.: Belgrano
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0001993-8	CONTRATO Nº:	015898	PLAZO DE CONTRATO:	12 meses
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	34/2017	FECHA DE CONTRATO:	15/2/2018	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:	09/10/2017	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	6/3/2018
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 130.521.644,09	MONTOS DE CONTRATO:	\$ 161.224.705,09	VENCIMIENTO:	6/3/2019
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS	
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	110	MONTO NUEVO:	\$ 161.224.707,12	PLAZO DE AMPLIACIÓN:	
FECHA DE ADJUDIC:	30/01/2018	RESOL. FECHA:	0	VENCIMIENTO:	
INTEGRANTES COMISIÓN:		% DE MODIFICACIÓN:	0,00%		
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN		AVANCE DE OBRA	
EMPRESA CONTRATISTA:	LAROMET S.A.	INSPECTOR DE OBRA:	Ing. Gerardo Tosoratti	A ORIGEN	REDETERMINADO
DOMICILIO LEGAL:	Corrientes Nº 2645 - Ciudad de Santa Fe	INSPECTOR ZONAL:		\$ 5.358.454,27	\$ 16.157.243,81
REPRESENTANTE TÉCNICO:	Ing. Civil Gonzalo Arturo Audet - Aceptado por el C.P.I.C. (sin Resol.			\$ 152.337.956,90	\$ 502.924.351,39
				94%	

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA


MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentación refiere a las obras necesarias para el alteo y obras de protección de taludes en un tramo de la OBRA: Ruta Provincial Nº 28-s. TRAMO: Ruta Nacional N° 178 - Montes de Oca. SECCION Km 7+000 - 15+400. La obra está ubicada en el Departamento Belgrano de la Provincia de Santa Fe. El trazado de la obra vial tiene una dirección predominante E-O y no se tiene previsto modificaciones del mismo. En su recorrido atraviesa una zona naturalmente baja, que, en periodos de lluvias importantes, ocasiona el corte de la calzada de la RPN° 28-s, como consecuencia del almacenamiento de los excesos hídricos pluviales.

DISEÑO ESTRUCTURAL

- carpeta de concreto asfáltico en caliente de 6cm de espesor y 6,50m de ancho.
- Base de Suelo — Arena — Piedra — Cemento, de 6.70 m de ancho y 20cm de espesor;
- Riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1.
- Riego de imprimación reforzada con emulsión asfáltica tipo CL-1
- Sub-base de Suelo — Cal de 7,20m de ancho, de 20cm de espesor.
- Subrasante mejorada con cal (2%), en 7,60m de ancho y 20cm de espesor
- Se prevén ensanches parciales de 0.60m de ancho y 0,50 m de profundidad para el asiento del paquete estructural en las zonas de empalme del alteo con el pavimento existente.- Esta estructura estará asentada sobre el terraplén con compactación especial según Especificaciones Técnicas
- Se ejecutaran alcantarillas transversales.

CROQUIS DE UBICACIÓN

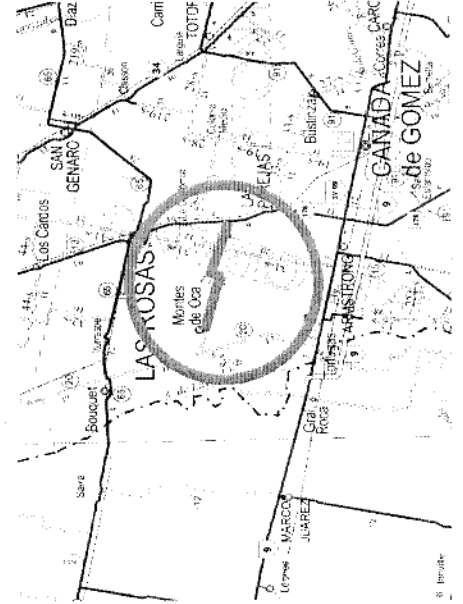

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



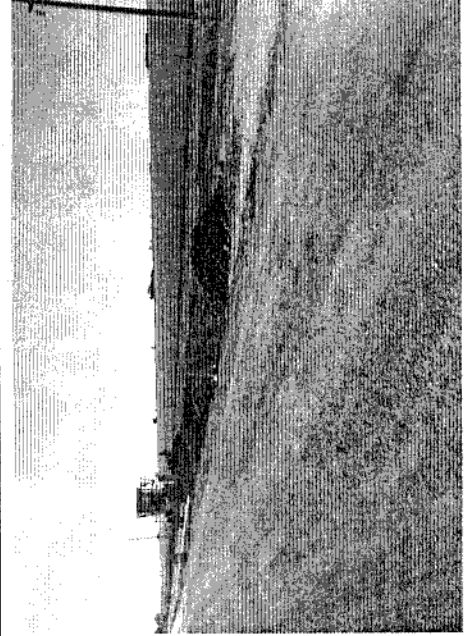


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA



■ Ejecutado ■ A ejecutar



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 28-S | **TRAMO: R.N.N° 178 - Montes de Oca** | **SECCIÓN: Km. 7+000 - Km. 15+400** | Hoja N° 511

TIPO DE OBRA: Alteo y Obras de Protección de Taludes | **LONGITUD:** DPTO.: Belgrano

DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°:	16108-0001993-8	CONTRATO N°:	015898	PLAZO DE CONTRATO:	12 meses
LICITACIÓN PÚBLICA N°:	34/2017	FECHA DE CONTRATO:	15/2/2018	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:	09/10/2017	CONVENIO N°:		INICIACIÓN:	6/3/2018
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 130.521.644,09	MONTO DE CONTRATO:	\$ 161.224.705,09	VENCIMIENTO:	6/3/2019
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios				
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	110				
FECHA DE ADJUDIC:	30/01/2018				
INTEGRANTES COMISIÓN:					

DE LA CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATISTA: LAROMET S. A.
DOMICILIO LEGAL: Corrientes N° 2645 - Ciudad de Santa Fe
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Civil Gonzalo Arturo Audet - Aceptado por el C.P.I.C. (sin Resol.)

INSPECTOR DE OBRA: Ing. Gerardo Tosoratti
INSPECTOR ZONAL:

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0017475-1	Readecuación del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones	12 MESES	6/3/2019	
16105-0018077-4	1° AMPLIACIÓN DE PLAZO	4 MESES	6/7/2019	823 (10/04/19)
16105-0018924-7	2° AMPLIACIÓN DE PLAZO	4 MESES	6/11/2019	1558 -(18/07/19)
16105-0019448-9	3° AMPLIACIÓN DE PLAZO	6 MESES	6/5/2020	030 (03/02/20)
16105-0020048-1	NEUTRALIZADA DESDE EL 01/01/20 HASTA EL 05/6/20			
	ACTA DE REINICIO (06/06/20)			
16105-0020349-9	4° AMPLIACIÓN DE PLAZO	7 MESES	6/1/2021	

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0018563-2	1176 (30/05/19)	\$ 2,03	0,00	\$ 161.224.707,12					
16105-0020418-8	959 (24/09/20)	\$ 15.622.214,20	9,69	\$ 176.846.919,29					

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA
COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:

Acta de Iniciación de los Trabajos, 06/03/2018, fecha a partir de la cual se contarán los plazos parciales y totales para la ejecución de la obra
 Corresp. Expte. N° 16105-0016143-6 /// La Contratista presenta para su aceptación como Rpte. Técnico al Ing. Civil Gonzalo Arturo Audet



OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 22-S		TRAMO: Cañada Rica - General Gelly		SECCIÓN:		OBRA Nº 520	
TIPO DE OBRA:		TIPO DE OBRA: Pavimentación de un tramo		LONGITUD: 8.830 mts.		0	
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS			
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0002229-7	CONTRATO Nº:	016542	PLAZO DE CONTRATO:	10 meses		
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	13/2018	FECHA DE CONTRATO:	5/11/2018	REPLANTEO:	25/11/2018		
FECHA DE LICITACIÓN:	20/04/2018	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	25/9/2019		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 145.709.341,03	MONTO DE CONTRATO:	\$ 411.930.455,75	VENCIMIENTO:	25/9/2019		
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS			
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	1054	MONTO NUEVO:	\$ 411.930.455,75	PLAZO DE AMPLIACIÓN:			
FECHA DE ADJUDIC:	18/07/2018	RESOL. FECHA:	0	VENCIMIENTO:			
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	0,00%				
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN		AVANCE DE OBRA			
EMPRESA CONTRATISTA:	ELEPRINT S.A. - TECSA S.A. (U.T.)	INSPECTOR DE OBRA:		CERTIFICACIÓN	A ORIGEN		
DOMICILIO LEGAL:	0	INSPECTOR ZONAL:	M.M.O. E. Leeuw		REDETERMINADO		
REPRESENTANTE TÉCNICO:	JACO RAFAEL HUMBERTO TAVERA (PROPUESTO) EXPTE. 161				\$ 34.929.658,23		
					\$ 274.730.074,71		
					67%		

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente documentación refiere a las obras necesarias para la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial Nº 22 s, comprendido entre las localidades de cañada rica y Gral. Gelly; en una longitud de 8.830 metros. La obra está ubicada en la zona Centro - Sur del Departamento Constitución.

El principio del tramo (Prog. 0+000) se fija en la intersección de la Ruta Prov. Nº 22 s con la calle de dirección Este-Oeste ubicada en el extremo sur de la localidad de Cañada Rica.

La obra finaliza en la zona urbana de la localidad de General Gelly.

DISEÑO ESTRUCTURAL

1. Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0,05m de espesor y 7,30m de ancho.
2. Riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1 a razón de 0,0005m³/m².
3. Riego de curado tipo CL-1 a razón de 0,0008m³/m².
4. Base de Suelo-Arena-Piedra-Cemento en 0,15m de espesor y 7,50m de ancho.
5. Riego de imprimación reforzada tipo CL-1 a razón de 1,8lts/m² c/6lts arena/m².
6. Sub-rasante Suelo-Arena-Cal en 0,15m de espesor y 7,80m de ancho.
7. Recubrimiento con suelo seleccionado de 0,16m de espesor y 8,10m de ancho.
8. Banquina con suelo vegetal en 3,00m de ancho.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

CROQUIS DE UBICACIÓN

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

Ejecutado: **33%**
Faltante: **67%**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
FOLIO Nº 10
Ejecutado

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-S **AMO:** Cañada Rica - General Gelly **Ubicación:** La obra esta ubicada en la zona Centro - Sur del Departamento Constitución Hoja N° 520

TIPO DE OBRA: Pavimentación de un tramo **LONGITUD:** 8.830 mts.

DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°:	16108-0002229-7	CONTRATO N°:	016542	PLAZO DE CONTRATO:	10 meses
LICITACIÓN PÚBLICA N°:	13/2018	FECHA DE CONTRATO:	5/11/2018	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:	20/04/2018	CONVENIO N°:		INICIACIÓN:	25/11/2018
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 145.709.341,03	MONTO DE CONTRATO:	\$ 120.767.263,00	VENCIMIENTO:	25/9/2019
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios				
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	1054				
FECHA DE ADJUDIC:	18/07/2018				
OFERTA	\$ 120.767.263,00				

DE LA CONTRATISTA
EMPRESA CONTRATISTA: ELEPRINT S.A. - TEGSA S.A. (U.T.)
DOMICILIO LEGAL: (***) ING. CIVIL E HIDRÁULICO RAFAEL HUMBERTO TAVERA
REPRESENTANTE TÉCNICO: (PROPUESTO) EXPTE. 16105-0020453-5 (ACEPTADO)

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0017672-6	ACORDE AL INICIO DE OBRA	10 Meses	25/9/2018	
16105-0018031-6	Ampliación de Plazo	2 Meses	25/11/2019	753 (05-04-19)
16105-0018803-1	Ampliación de Plazo	2 Meses	25/1/2020	1559 (19/07/19)
16105-0019120-8	READECUACIÓN PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN	2 Meses	25/1/2020	
16105-0020455-7	ACTA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 07-08-20			
16105-0020454-6	NUEVO PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INV. ADAPTADO A LAS OBRAS FALTANTES	9 meses	7/5/2021	

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA
COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:
 (*) EXPTE. 16105-0017737-8 - TRAMITA LA APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ING. RAFAEL HUMBERTO TAVERA
 (**) EXPTE. 16105-0018033-8 - TRAMITA LA APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ING. CIVIL AGUSTÍN ARMANDO DOS RAMOS EN REEMPLAZO DEL ING. RAFAEL HUMBERTO TAVERA
 *** EXPTE. 16105-0020453-5 (PRESENTA AL ING. CIVIL E HIDRÁULICO RAFAEL HUMBERTO TAVERA, EN REEMPLAZO DEL ING. CIVIL AGUSTÍN DOS RAMOS)
 **** EXPTE. 16105-0020573-0 (PRESENTA A LA ING. CIVIL VERONICA ALICIA EIZMENDI EN REEMPLAZO DEL ING. RAFAEL HUMBERTO TAVERA - 29/10/20)



OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 10		TRAMO: Gálvez - Bernardo de Irigoyen		SECCIÓN:	OBRA Nº
TIPO DE OBRA: Pavimentación		LONGITUD: 13.755 mts.		DPTO.: San Jerónimo	
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	22/17	CONTRATO Nº:	015575	PLAZO DE CONTRATO:	12 meses
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	27/06/2017	FECHA DE CONTRATO:	23/10/2017	REPLANTEO:	10/11/2017
FECHA DE LICITACIÓN:	\$ 224.710.394,65	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	10/11/2018
PRESUPUESTO OFICIAL:	Fondos Propios	MONTO DE CONTRATO:	\$ 34.199.306,18	VENCIMIENTO:	
FINANCIAMIENTO:	1273	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS	
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	04/09/2017	MONTO NUEVO:	\$ 36.198.354,21	PLAZO DE AMPLIACIÓN:	
FECHA DE ADJUDIC:		RESOL. FECHA:	0	VENCIMIENTO:	
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	5,52%		
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN		AVANCE DE OBRA	
EMPRESA CONTRATISTA:	POSE S.A.	INSPECTOR DE OBRA:	Ing. Alejandro Borghetti	A ORIGEN	REDETERMINADO
DOMICILIO LEGAL:	San Juan Nº 2250 - Ciudad de Santa Fe	INSPECTOR ZONAL:		\$ 0,00	\$ 0,00
REPRESENTANTE TÉCNICO:	0			\$ 29.542.838,92	\$ 117.246.469,29
				82%	


RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

DISEÑO ESTRUCTURAL

1. Carpeta de rodamiento en 0,07m. Esp. y 7,30m. de ancho, con su riego de liga.
2. Base de Estabilizado Granular Cementado en 0,20 m. de Espesor y 7,50 m.de ancho, con su correspondiente riego de curado.
3. Sub-Base de suelo - arena - cal en 0,20 m. de espesor y 8,00 de ancho.
4. Subrasante de suelo seleccionado - cal, en 0,30m. esp. Y 8,60m. de ancho.
5. Terraplen compactado. 6. Banquinas compactadas y vegetadas.

MEMORIA DESCRIPTIVA
 La presente documentación refiere a las obras necesarias para la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 10, en el tramo entre la Prog. 44+150 (RPNº 50-s, en la localidad de Bernardo de Irigoyen) y la intersección con la RPNº 80, en una longitud de 13.755 metros. La obra está ubicada en la zona Centro del Departamento San Jerónimo de esta provincia.
 El principio del tramo (Prog. 44+150) se fija en la ruta provincial N°50-s. El eje de proyecto coincide con el de Obra Básica hasta la Prog.44+675.38 donde se produce una curva de 600m de radio, la cual empalma la RPNº 41-s y la RPNº10 retomando ésta su trazado original con un desplazamiento del eje unos 17m hacia la derecha, dicho desplazamiento se amplía a 22 metros a partir de la prog. 51+569, desde este punto y hasta el final se mantendrá el trazado a campo traviesa, preservando la zona que estará destinada al emplazamiento un predio industrial. En Prog. 57+905,09 fijado en el borde de pavimento de la RPNº 80 se ejecutará un enlace canalizado que complementará al existente, el mismo contará con iluminación exigida en proximidad de aeroclub de Galvez, y la correspondiente señalización.

CROQUIS DE UBICACIÓN

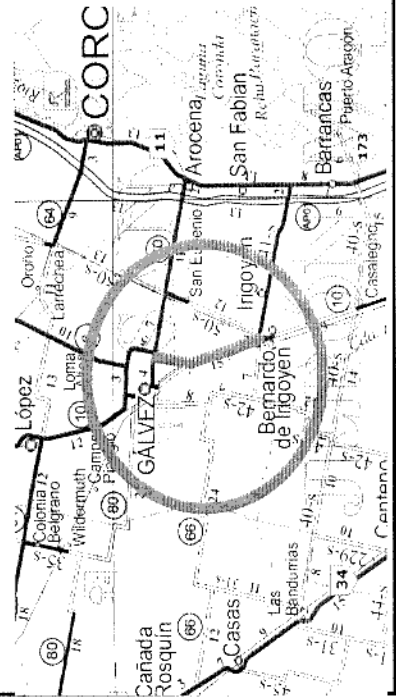

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



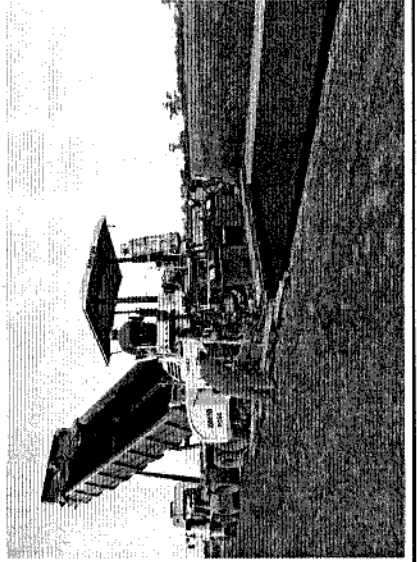


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

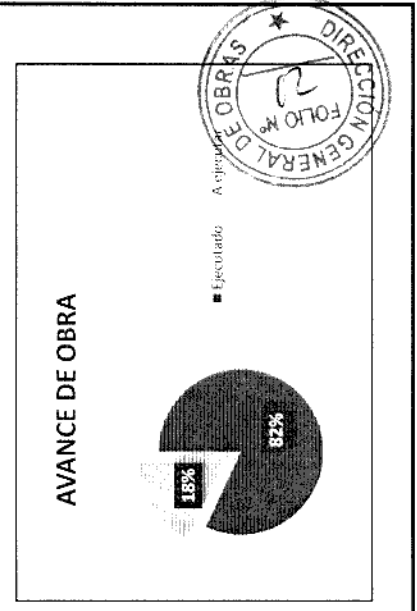

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 63		TRAMO: San Vicente - María Juana - Primera Etapa (Acceso a María Juana)		SECCIÓN:		Hoja N° 493	
TIPO DE OBRA: Estabilizado granular		LONGITUD: 3,25km.		DPTO.: Castellanos			
DE LOS ANTECEDENTES				DEL CONTRATO			
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°: 16108-0001760-8		CONTRATO N°: 015339		PLAZO DE CONTRATO: 10 meses		DE LOS PLAZOS	
LICITACIÓN PÚBLICA N°: 13/2017		FECHA DE CONTRATO: 10/8/2017		REPLANTEO:			
FECHA DE LICITACIÓN: 25/04/2017		CONVENIO N°:		INICIACIÓN: 1/9/2017			
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 27.997.461,88		MONTO DE CONTRATO: \$ 34.199.306,18		VENCIMIENTO: 1/7/2018			
FINANCIAMIENTO: Fondos Propios							
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC: 1049							
FECHA DE ADJUDIC: 19/07/2017							
INTEGRANTES COMISIÓN:							
DE LA CONTRATISTA				DE LA INSPECCIÓN			
EMPRESA CONTRATISTA: ROVIAL S. A.		INSPECTOR DE OBRA: M.M.O. G. Ceresole					
DOMICILIO LEGAL: Francia N° 1618 - Ciudad de Santa Fe		INSPECTOR ZONAL: M.M.O. E. Leeuw					
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Civil Néstor C. Nardelli - Aceptado por el C.P.I.C. (sin Resol.)							

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0015435-5		5 meses	1/12/2018	• 320 (08/03/2018)
16105-0016444-4	Readecuación Plan de Trabajos y Curva de Inversiones	5 meses	1/12/2018	
16105-0017308-4	Readecuación Plan de Trabajos y Curva de Inversiones	5 meses	1/12/2018	
16105-0017742-6		4 meses	1/4/2019	233 (05/02/19)
16105-0018433-4		3 meses	1/7/2019	1037 (06/05/19)
16105-0019036-8		3 meses	1/10/2019	1811 (30/08/19)
16105-0019545-5		4 meses	1/2/2020	427 (18/06/20)
16105-0019786-6	Neutralización Inicio 01/11/19			Convenio N° 34625

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0019423-8	2122 (30/10/19)	\$ 1.999.048,03	5,85	\$ 36.198.354,21					

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	RESOLUCIÓN APROBATORIA	FECHA DE RECEPCIÓN
COMISIÓN:		COMISIÓN:	
	RESOLUCIÓN:		RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:

Acta de Iniciación de los Trabajos, 01/09/2017, fecha a partir de la cual se contarán los plazos parciales y totales para la ejecución de la obra
 Corresp. Expte. N° 16105-0014827-3 /// La Contratista presenta para su aceptación como Rpte. Técnico al Ing. Civil Edgardo Ragalli
 • Resol. N° 320 (08/03/2018): Corresp. Expte. N° 16105-0015435-5 /// Aprueba también el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
 Corresp. Expte. N° 16105-0016742-9 /// La Contratista presenta para su aceptación como Rpte. Técnico al Ing. Civil Néstor Nardelli (en reemplazo del Ing. Civil Edgardo Ragalli)



OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 15		TRAMO. J. Nº 9 (Armstrong) - R.P. Nº 92 (Cruz Alta)		SEC. J:	OBRA Nº 461
TIPO DE OBRA: Repavimentación		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
DE LOS ANTECEDENTES		CONTRATO Nº: 014853		PLAZO DE CONTRATO: 9 meses	
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº: 16108-0001628-5	FECHA DE CONTRATO: 7/1/2016	FECHA DE CONTRATO: 26/1/2017		REPLANTEO: 14/2/2017	
FECHA DE LICITACIÓN: 14/12/2016	CONVENIO Nº: \$ 128.426.313,85	MONTO DE CONTRATO: \$ 147.733.271,55		VENCIMIENTO: 14/11/2017	
PRESUPUESTO OFICIAL: Fondos Propios	1789	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS	
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC: 30/12/2016	% DE MODIFICACIÓN:	MONTO NUEVO: \$ 330.492.553,68		PLAZO DE AMPLIACIÓN:	
INTEGRANTES COMISION:	DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR DE OBRA: Tco. Carlos A. Ramirez		VENCIMIENTO:	
EMPRESA CONTRATISTA: NESTOR JULIO GUERCHET S.A.	DE LA CONTRATISTA	INSPECTOR ZONAL:		AVANCE DE OBRA	
DOMICILIO LEGAL: Boulevard Gálvez Nº 2088 - Ciudad de Santa Fe	REPRESENTANTE TÉCNICO: ivil José A. H. Orlandi - Aceptado por el C.P.I.C. (Sin Resolu	CERTIFICACIÓN		A ORIGEN	
		EN EL MES		REDETERMINADO	
		ACUMULADO		\$ 95.843.186,24	
		% DE EJECUCIÓN		\$ 1.194.234.842,72	
				99%	

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial n°15, comprendido entre las localidades de Armstrong (Ruta nacional n°9) y la Ruta Provincial n°92, que lleva ala Localidad de Cruz Alta ciudad limitrofe de la Provincia de Córdoba, en una longitud de aproximadamente 35.200 metros.

La obra está ubicada en la zona sur, dentro del Departamento Belgrano en su mayor parte y algo del Departamento Caseros.


DISEÑO ESTRUCTURAL

1. Carpeta de rodamiento en 0,05m. Esp. y 7,30m. de ancho
- 2 Base de Concreto asf. en 0,06m. Esp. y 7,40m. de ancho
- 3 Base de Estab. Granular en 0,15m. esp. Y 7,52m. de ancho
3. Sub Base Suelo Arena Cal en 0,15m. esp. Y 7,82m. de ancho
4. Subrasante tartada co cal en 0,15m. esp. Y 8,12 m. de ancho

El riego de Liga con material bituminoso serán de 0,0006m3/m2 en la Carpeta y Base, y el de sellado curado de la Base de estabilizado, a razón de 0,0008m3/m2 respectivamente.

Está previsto traslado de alambrados, construcción de alcantarillas transversales, laterales y ejecución de terraplén.

CROQUIS DE UBICACIÓN

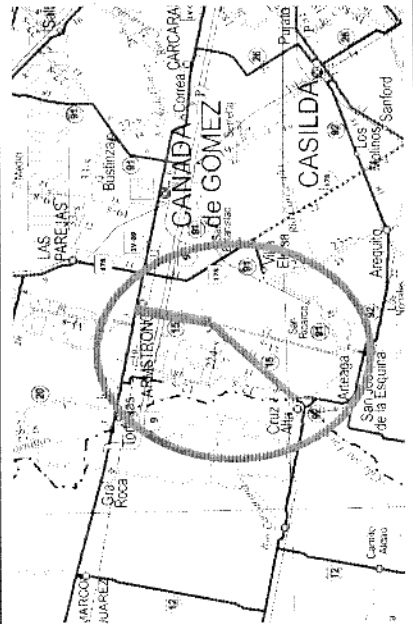

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA


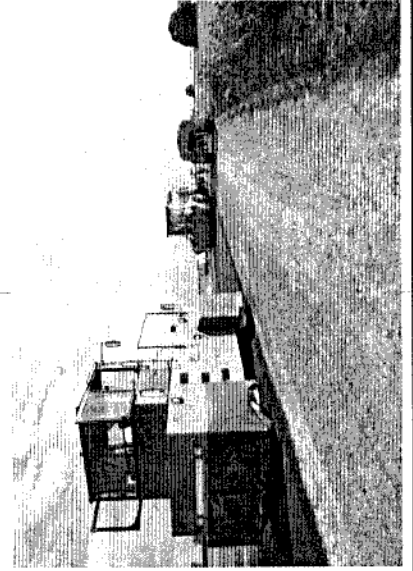


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

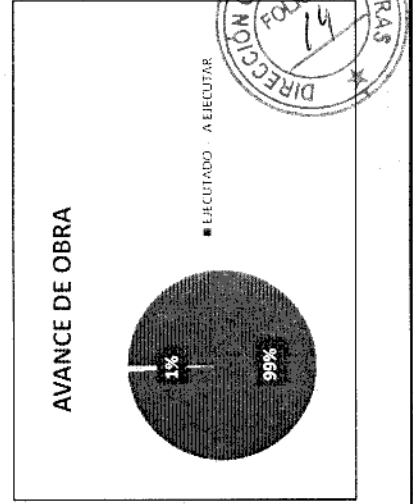

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 15		TRAMO: R.N.N° 9 (Armstrong) - R.P.N° 92		SECCIÓN:		Hoja N° 461	
TIPO DE OBRA: Repavimentación		Cruz Alta)		LONGITUD: 35,200 Km.		DPTO.: Belgrano	
DE LOS ANTECEDENTES				DEL CONTRATO			
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°: 16108-0001628-5		CONTRATO N°: 014853		PLAZO DE CONTRATO: 9 meses		DE LOS PLAZOS	
LICITACIÓN PÚBLICA N°: 71/2016		FECHA DE CONTRATO: 26/1/2017		REPLANTEO:			
FECHA DE LICITACIÓN: 14/12/2016		CONVENIO N°:		INICIACIÓN: 14/2/2017			
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 128.426.313,85		MONTO DE CONTRATO: \$ 147.733.271,55		VENCIAMIENTO: 14/11/2017			
FINANCIAMIENTO: Fondos Propios							
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC: 1789							
FECHA DE ADJUDIC: 30/12/2016							
INTEGRANTES COMISIÓN:							
DE LA CONTRATISTA				DE LA INSPECCIÓN			
EMPRESA CONTRATISTA: NESTOR JULIO GUERECHET S. A.		INSPECTOR DE OBRA: Tco. Carlos A. Ramirez					
DOMICILIO LEGAL: Boulevard Gálvez N° 2088 - Ciudad de Santa Fe		INSPECTOR ZONAL: Ing. Erico Sigríst					
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Civil José A. H. Orlandi - Aceptado por el C.P.I.C. (Sin Resolución)							

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIAMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0013740-6	Acorde Inicio de los Trabajos	9 meses	14/11/2017	
16105-0014911-3		3 meses	14/2/2018	*1772 (27/11/2017)
16105-0015722-6		2 meses	14/4/2018	*415 (28/03/2018)
16105-0016045-9		2 meses	14/6/2018	*1336 (23/08/2018)
16105-0016366-3		1 mes	14/7/2018	*1335 (23/08/2018)
(*)	NEUTRALIZACIÓN DE PLAZO			
16105-0017897-5	REINICIO (19/01/19)	5 meses	19/6/2019	667 (22/03/19)
16105-0018517-1	PLAN DE TRABAJOS READECUADO	-	19/6/2019	677 -
16105-0018940-9	AMPLIACIÓN DE PLAZO (5 MESES)	5 meses	19/11/2019	1565 (22/07/2019)
16105-0019420-5	READECUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS	5 meses	19/11/2019	2130 (30/10/19)
(**)	NEUTRALIZACIÓN DE PLAZO			
16105-0020324-8	AMPLIACIÓN DE PLAZO (8 MESES) - ACTA DE REINICIO	8 meses	24/2/2021	654 (07-08-20)
16105-0020631-5	PLAN DE TRABAJOS READECUADO	"	24/2/2021	

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0014312-0	*1454 (28/09/2017)	\$ 43.577.490,27	29,497	\$ 191.310.761,82
16105-0015672-2	966 (29/06/2018)	\$ 50.577.409,29	34,236	\$ 198.310.680,84
16105-0017649-4	2108 (28/12/18)	\$ 154.994.840,33	104,92	\$ 302.728.111,88
16105-0018985-6	1817 (30/08/19)	\$ 154.994.840,33	104,92	\$ 302.728.111,88
16105-0020429-2	1134 (21/10/20)	\$ 182.759.282,13	123,71	\$ 330.492.553,68

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	RESOLUCIÓN APROBATORIA	FECHA DE RECEPCIÓN



COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:
OBSERVACIONES:			
Acta de Inicio de los Trabajos /// Se ha establecido el día 14/02/2017 como fecha de inicio de los trabajos			
Corresp. Expte. N° 16105-0013741-7 /// La Contratista designa al Ing. Civil José Abel Héctor Orlandi como Representante Técnico de la Obra			
•Resol. N° 1454 (28/09/2017): Corresp. Expte. N° 16105-0014312-0 /// Aprueba también, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones			
•Resol. N° 1772 (27/11/2017): Corresp. Expte. N° 16105-0014911-3 /// Aprueba también, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones			
•Resol. N° 415 (28/03/2018): Corresp. Expte. N° 16105-0015722-6 /// Aprueba también, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones			
•Resol. N° 1335 (23/08/2018): Corresp. Expte. N° 16105-0016366-3 /// Aprueba también, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones			
•Resol. N° 1336 (23/08/2018): Corresp. Expte. N° 16105-0016045-9 /// Aprueba también, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones			
(*) ACTA NEUTRALIZACION DE PLAZO: a partir del 14/07/2018, y por el tiempo que demande la normalización de las causales expuestas en dicha acta			
(* *) ACTA NEUTRALIZACION DE PLAZO: a partir del 01/09/2019, por el término de 5 meses (31/03/20)			



OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 36		TRAMO: Romang - Vera (Primera Etapa)		SECCIÓN:		OBRA Nº 506	
TIPO DE OBRA: Pavimentación		TIPO DE OBRA: Pavimentación		LONGITUD:		DPTO.:	
DE LOS ANTECEDENTES				DEL CONTRATO			
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0001948-8	CONTRATO Nº:	016106	PLAZO DE CONTRATO:		10 meses	
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	27/2017	FECHA DE CONTRATO:	30/5/2018	REPLANTEO:			
FECHA DE LICITACIÓN:	01/09/2017	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	19/6/2018		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 209.327.770,71	MONTO DE CONTRATO:	\$ 204.492.309,39	VENCIMIENTO:	19/4/2019		
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS			
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	1893	MONTO NUEVO:	\$ 204.492.309,39	PLAZO DE AMPLIACIÓN:			
FECHA DE ADJUDIC:	14/12/2017	RESOL. FECHA:	0	VENCIMIENTO:			
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	0,00%				
DE LA CONTRATISTA				AVANCE DE OBRA			
EMPRESA CONTRATISTA:	U.T. Vial Agro S.A. - ICA S.R.L. - R.P. Nº 36	INSPECTOR DE OBRA:	M.M.O. Gabriel Zapata	CERTIFICACIÓN		REDETERMINADO	
DOMICILIO LEGAL:	Avenida Gdor. Freyre Nº 1746	INSPECTOR ZONAL:		EN EL MES		\$ 39.884.466,08	
REPRESENTANTE TÉCNICO:	0			ACUMULADO		\$ 637.484.325,29	
				% DE EJECUCIÓN		68%	

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentación refiere a las obras proyectadas para la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 36, en el tramo entre la Ruta Provincial Nº 1 y la localidad de Colonia Sager, en el Departamento San Javier, ubicado al noreste de la Provincia de Santa Fe.

La longitud de la obra es de 16,20 km y en su recorrido alcanza la localidad de Colonia Sager, además de cruzar el arroyo "El Gusano".

La progresiva 0+000 se encuentra en la intersección con la Ruta Provincial Nº 1, aproximadamente a 2 km de la localidad de Romang, depto. San Javier. Se optó por el diseño de un enlace canalizado.

A partir de este punto, en dirección Oeste, atraviesa un par de curvas, hasta alcanzar el Arroyo "El Gusano" en la progresiva 5+856, el cual es salvado por un puente existente de aproximadamente 105 metros de largo.

En la progresiva 15+890, la ruta alcanza Colonia Sager, desde donde existe la posibilidad de acceder a Colonia Durand por un camino de calzada natural existente.

DISEÑO ESTRUCTURAL

1. Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 7,30 m de ancho y 0,05 m de espesor.

2. Riego de Liga con material bituminoso tipo CRR0 en 7,30 m de ancho.

Curado con material bituminoso tipo CL0 en 7,50 m de ancho.

Granular Cementado en 7,50 m de ancho y 0,15 m de espesor.

material bituminoso tipo CL0 en 7,90 m de ancho.

ancho y 0,20 m de espesor.

ancho y 0,30 m de espesor.

9. Nucleo del Terraplen.

3. Riego de

4. Base de Estabilizado


5. Riego de Imprimación con

6. Sub-base de Suelo Cal en 7,90 m de

7. Sub-Rasante mejorada con Cal en 8,40 m de

8. Excavación de Caja.

CROQUIS DE UBICACIÓN

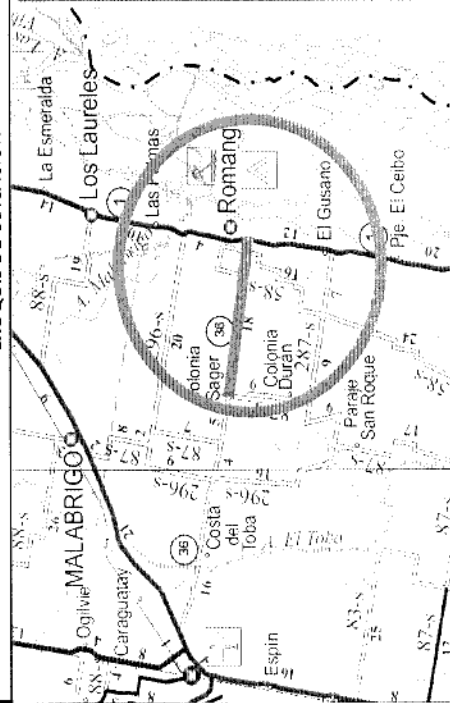

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA


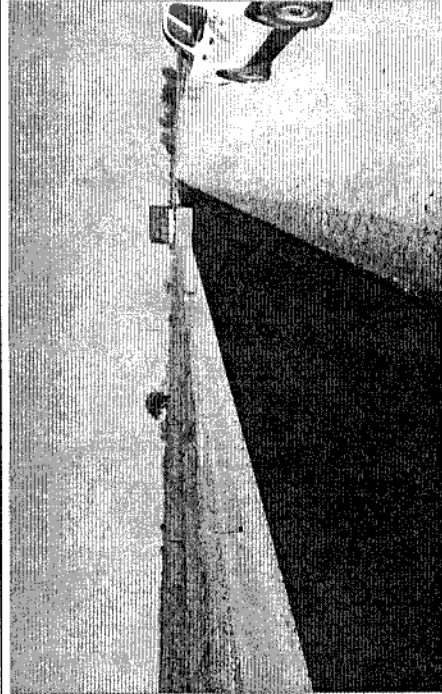


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

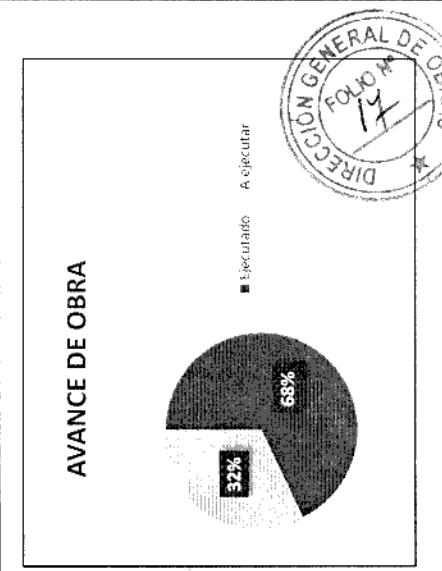

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 36		TRAMO: Romang - Vera (Primera Etapa)		Hoja N° 506	
TIPO DE OBRA: Pavimentación		LONGITUD:		DPTO.:	
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°: 16108-0001948-8	CONTRATO N°: 016106	PLAZO DE CONTRATO: 10 meses	REPLANTEO:	INICIACIÓN:	19/6/2018
LICITACIÓN PÚBLICA N°: 27/2017	FECHA DE CONTRATO: 30/5/2018	INCREMENTO PRESUP. OF.	VENCIAMIENTO:	19/4/2019	
FECHA DE LICITACIÓN: 01/09/2017	CONVENIO N°:				
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 209.327.770,71	MONTO DE CONTRATO: \$ 204.492.309,39				
FINANCIAMIENTO: Fondos Propios					
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC. 1893					
FECHA DE ADJUDIC. 14/12/2017					
INTEGRANTES COMISIÓN:					
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN			
EMPRESA CONTRATISTA: U. T. Vial Agro S.A. - ICA S.R.L. - R.P. N° 36	INSPECTOR DE OBRA: M.M.O. Gabriel Zapata				
DOMICILIO LEGAL: Avenida Gdor. Freyre N° 1746	INSPECTOR ZONAL:				
REPRESENTANTE TÉCNICO:					

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIAMIENTO	RESOLUCIÓN
(*)	Neutralización Plazo de Obra	2 meses	19/8/2018	
(**)	Reinicio (24/08/2018)	10 meses	24/6/2019	
16105-0017787-3	Readecuado	10 meses	24/6/2019	
16105-0018217-4		3 meses	24/9/2019	923 (23/04/19)
16105-0019040-5	Readecuado	4 meses	24/1/2020	1711 (12/08/19)
16105-0019413-5		-	24/1/2019	071 (06/02/20)
16105-0020565-9	(ACTA DE REINICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 21-09-20)	7 meses	21/4/2021	

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0019466-3	ANULADO	\$ 5.882.327,24	2,88	\$ 210.374.636,63					
16105-0020566-0		\$ 20.406.373,54	9,98	\$ 224.898.682,93					

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN
COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:

(*) ACTA NEUTRALIZACIÓN DE PLAZO: a partir del 19/06/2018 y por el término de 2 meses

(**) ACTA DE REINICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: a partir del 24/08/2018 y por el término de 10 meses



OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 63		TRAMO: San Vicente - María Juana - Primera Etapa (Acceso a Colonia Margarita)		SECCIÓN:		OBRA Nº 488	
TIPO DE OBRA: Estabilizado granular		TIPO DE OBRA: Estabilizado granular		LONGITUD: 7,80Km.		DPTO.: Castellanos	
DE LOS ANTECEDENTES				DEL CONTRATO			
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-001694-2	CONTRATO Nº:	015195	PLAZO DE CONTRATO:	12 meses	DE LOS PLAZOS	
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	04/2017	FECHA DE CONTRATO:	27/6/2017	REPLANTEO:			
FECHA DE LICITACIÓN:	20/02/2017	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	17/7/2017		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 182.671.992,80	MONTO DE CONTRATO:	\$ 168.540.045,49	VENCIMIENTO:	17/7/2018		
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS			
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	704	MONTO NUEVO:	\$ 178.068.832,40	PLAZO DE AMPLIACIÓN:			
FECHA DE ADJUDIC:	29/05/2017	RESOL. FECHA:	2123 (30/10/19)	VENCIMIENTO:			
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	5,35%				
DE LA CONTRATISTA				AVANCE DE OBRA			
EMPRESA CONTRATISTA:	ROVIAL S.A.	INSPECTOR DE OBRA:	M.M.O. G. Ceresole	A ORIGEN	REDETERMINADO		
DOMICILIO LEGAL:	Francia Nº 1618 - Ciudad de Santa Fe	INSPECTOR ZONAL:	M.M.O. E. Leeuw	\$ 5.942.638,96	\$ 21.047.633,62		
REPRESENTANTE TÉCNICO:	g. Civil Néstor Nardelli - Aceptado por el C.P.I.C. (sin Reso			\$ 153.476.343,79	\$ 624.985.987,96		
				86%			

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA


MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto contempla las Obras necesarias para el mejoramiento y pavimentación la R.P. Nº63, en el tramo entre las localidades de San Vicente y Colonia Margarita, en una longitud aproximada de 7,80 Km y construcción del nuevo puente de Hº Aº y Pretensado sobre el canal "Cañada Los Corralitos" de 3 vanos de 20m de luz cada uno. El trazado se desarrolla en coincidencia con la actual Ruta prov. Nº 63.

DISEÑO ESTRUCTURAL

1. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN 0,05m DE ESPESOR Y 7,30m DE ANCHO.-
2. RIEGO DE LIGA CON CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA TIPO CRR-0 A RAZON DE 0,0005 m3/m2 EN 7,30m DE ANCHO.-
3. RIEGO DE CURADO CON CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA TIPO CL-0 A RAZON DE 0,0008 m3/m2 EN 7,50m DE ANCHO.-
4. SUELO - ARENA - CEMENTO EN 0,20M DE ESPESOR Y 7,90M DE ANCHO.-
5. TERRAPLEN COMPACTADO -
6. SANEAMIENTO DE LA SUBRASANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES

CROQUIS DE UBICACIÓN

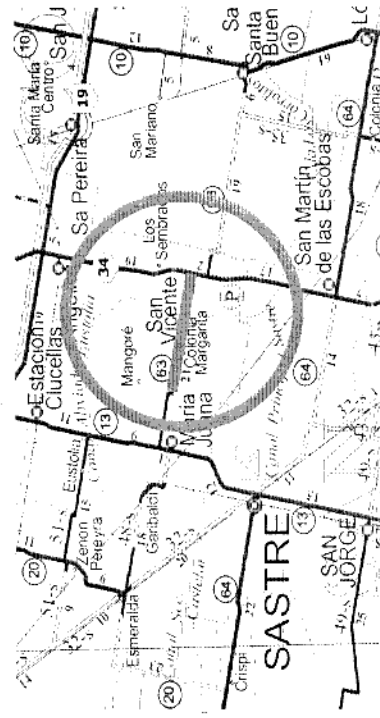

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

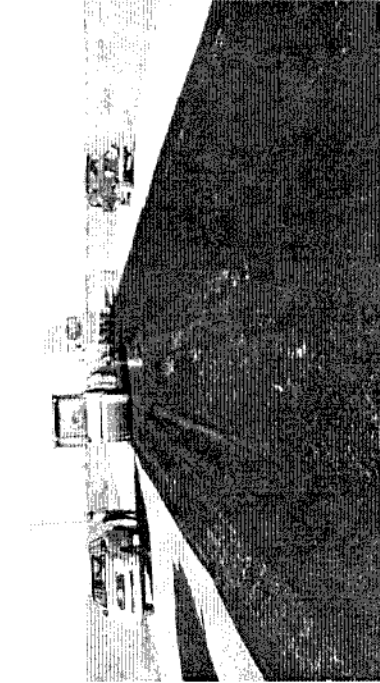


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 63		TRAMO: San Vicente - María Juana - Primera pa (Acceso a Colonia Margarita)		Hoja N° 488	
TIPO DE OBRA: Estabilizado granular		LONGITUD: 7,80Km.		DPTO: Castellanos	
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°:	16108-001694-2	CONTRATO N°:	015195	PLAZO DE CONTRATO:	12 meses
LICITACIÓN PÚBLICA N°:	04/2017	FECHA DE CONTRATO:	27/6/2017	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:	20/02/2017	CONVENIO N°:		INICIACIÓN:	17/7/2017
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 182.671.992,80	MONTO DE CONTRATO:	\$ 168.540.045,49	INCREMENTO PRESUP. OFICIAL:	
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios			VENCIAMIENTO:	17/7/2018
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	704			DE LA INSPECCIÓN	
FECHA DE ADJUDIC:	29/05/2017			M.M.O. G. Ceresole	
INTEGRANTES COMISIÓN:				M.M.O. E. Leeuw	
DE LA CONTRATISTA		INSPECTOR DE OBRA:			
EMPRESA CONTRATISTA:		INSPECTOR ZONAL:			
ROVIAL S.A.					
Francia N° 1618 - Ciudad de Santa Fe					
REPRESENTANTE TÉCNICO:					
Ing. Civil Néstor Nardelli - Aceptado por el C.P.I.C. (sin Resol.)					

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIAMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0015437-7		6 meses	17/1/2019	*198 (09/02/2018)
16105-0017867-6		6 meses	17/7/2019	384 (20-02-19)
16105-0018679-0		3 meses	17/10/2019	1503 (05/07/19)
16105-0019546-6		5 meses	17/3/2020	072 (06/02/20)
16105-0019884-3	Readecuación Plan y Curva	-	-	093 (12/02/20)
16105-0020027-4	NEUTRALIZADA A PARTIR DEL 15/01/20			
16105-0020338-5	REINICIO DE TRABAJOS (16/06/20)			
16105-0020356-9	NUEVO PLAN DE TRABAJOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO	9 meses	16/3/2021	795 (26/08/20)

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0019422-7	2123 (30/10/19)	\$ 9.528.786,91	5,65	\$ 178.068.832,40

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA
COMISIÓN:		COMISIÓN:	
	RESOLUCIÓN:		RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:

Corresp. Expte. N° 16105-0015132-5 /// La Contratista presenta para su aceptación como Rpte. Técnico al Ing. Civil Edgardo Rogalli
 Acta de Iniciación de los Trabajos, 17/07/2017, fecha a partir de la cual se contarán los plazos parciales y totales para la ejecución de la obra
 • Resol. N° 198 (09/02/2018): Corresp. Expte. N° 16105-0015437-7 /// Aprueba también el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
 Corresp. Expte. N° 16105-0016744-1 /// La Contratista presenta para su aceptación como Rpte. Técnico al Ing. Civil Néstor Nardelli (en reemplazo del Ing. Civil Edgardo Rogalli)



OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 88-S		TP AMO: R.P. Nº 3 - Unidad Penitenciaria de		SECCIÓN:		OBRA Nº 504	
TIPO DE OBRA: Pavimentación				LONGITUD:			
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS			
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0001956-9	CONTRATO Nº:	015801	PLAZO DE CONTRATO:	8 meses		
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	28/2017	FECHA DE CONTRATO:	11/1/2018	REPLANTEO:			
FECHA DE LICITACIÓN:	01/09/2017	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	9/2/2018		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 66.847.970,42	MONTO DE CONTRATO:	\$ 74.153.353,35	VENCIMIENTO:	9/10/2018		
FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS			
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	1844	MONTO NUEVO:	\$ 85.746.861,11	PLAZO DE AMPLIACIÓN:			
FECHA DE ADJUDIC:	07/12/2017	RESOL. FECHA:	2150 (31/10/19)	VENCIMIENTO:			
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	13,52%				
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN		AVANCE DE OBRA			
EMPRESA CONTRATISTA:	PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.	INSPECTOR DE OBRA:	M.M.O. Cristian Macedo	CERTIFICACIÓN	A ORIGEN	REDETERMINADO	
DOMICILIO LEGAL:	Pasaje Drago Nº 3630 - Ciudad de Santa Fe	INSPECTOR ZONAL:		EN EL MES	\$ 11.393.677,04	\$ 30.534.654,88	
REPRESENTANTE TÉCNICO:	5105-0019256-2 desvincula al Ing. Villalba, propone en su			ACUMULADO	\$ 68.623.310,99	\$ 268.010.389,09	
				% DE EJECUCIÓN	80%		

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA	
MEMORIA DESCRIPTIVA	
<p>La presente documentación refiere a las obras necesarias para la pavimentación de la R.P. Nº 88-s, en el tramo comprendido entre la R.P. Nº 3 y el acceso a la Unidad Penitenciaria de Santa Felicia (UPSF), y la pavimentación de dicho acceso. El origen del tramo, progresiva 0+000 del Proyecto, está ubicado en la intersección con la R.P. Nº 3, y tiene un desarrollo de 5.375 m sobre la R.P. Nº 88-s, hasta el acceso al predio de la Unidad Penitenciaria Santa Felicia; dentro de dicho predio, la obra tiene un desarrollo de 890 m, aproximadamente. La obra está ubicada en el Departamento Vera, 8,5 km al Norte de la ciudad de Vera por la R.P. Nº 3, como se muestra en los planos de proyecto.</p>	
DISEÑO ESTRUCTURAL	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 6,70 m de ancho y 0,05 m de espesor. 2. Riego de Liga con material bituminoso tipo CRR1 en 6,70 m de ancho. 3. Riego de Imprimación con material bituminoso tipo CRL1 en 7,00 m de ancho. 4. Base de Suelo-Arena-Piedra-Cemento en 7,00 m de ancho y 0,18 m de espesor. 5. Riego de Imprimación con material bituminoso tipo CRL1 en 7,40 m de ancho. 6. Suelo seleccionado estabilizado con Cemento en 7,40 m de ancho y 0,15 m de espesor. 7. Suelo seleccionado en 0,20 m de espesor y en banquetas. 8. Sub-Rasante compactada en 7,90 m de ancho y 0,20 m de espesor. 9. Terraplen con compactación especial. 	

CROQUIS DE UBICACIÓN	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	
GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 88-5	TRAMO: R.P.N° 3 - Unidad Penitenciaria de Santa Felicia	SECCION:	Hoja N° 504
TIPO DE OBRA: Pavimentación		LONGITUD:	DPTO.: Vera
DE LOS ANTECEDENTES		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°: 16108-0001956-9	CONTRATO N°: 015801	PLAZO DE CONTRATO: 8 meses	
LICITACIÓN PÚBLICA N°: 28/2017	FECHA DE CONTRATO: 11/11/2018	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN: 01/09/2017	CONVENIO N°:	INIICIACIÓN:	9/2/2018
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 66.847.970,42	MONTO DE CONTRATO: \$ 74.153.353,35	VENCIMIENTO:	9/10/2018
FINANCIAMIENTO: Fondos Proprios			
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC: 1844			
FECHA DE ADJUDIC: 07/12/2017			
INTEGRANTES COMISION:			
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN	
EMPRESA CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.	INSPECTOR DE OBRA: M.M.O. Cristian Macedo		
DOMICILIO LEGAL: Pasaje Drago N° 3630 - Ciudad de Santa Fe	INSPECTOR ZONAL:		
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Civil Luis A. Villalba - Aceptado por el C.P.I.C. (sin Resol.)			
Expte. 16105-0019256-2 desvincula al Ing. Villalba , propone en su reemplazo a la Ing. Civil Patricia Gabriela Mussa desde el (01/07/19)			

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0015869-4	Acorde Inicio de los Trabajos	8 meses	9/10/2018	
16105-0016385-8	1º Ampl. De Plazo	4 meses	9/2/2019	•1509 (21/09/2018)
16105-0017770-3	2º Ampl. De Plazo	4 meses	9/6/2019	1031 (06/05/19)
16105-0018892-7	3º Ampl. De Plazo	4 meses	9/10/2019	1593 (25/07/2019)
16105-0019598-3	4º Ampl. De Plazo	4 meses	9/2/2020	029 (03/02/20)
16105-0019885-4	ADECUACIÓN PLAN DE TRABAJOS	-	9/2/2020	310 (26/05/20)
16105-0020043-6	5º Ampl. De Plazo	7 meses	9/9/2020	389 (08/06/20)
16105-0020377-6	NEUTRALIZADA A PARTIR DEL 01/03/20			
16105-0020378-7	ACTA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS (01/05/20)	7 meses	9/9/2020	937 (22/09/20)
16105-0020485-6	PLAN DE TRABAJOS READECUADO AL ACTA DE REINICIO DE LA OBRA (01/05/20)	6 meses	9/3/2021	
	6ºta. Ampl. De Plazo			
	NEUTRALIZADA A PARTIR DEL 09/09/20			

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0019585-7	2150 (31/10/19)	-\$ 2.386.404,21	-3,22	\$ 71.766.949,14
16105-0020502-8		\$ 11.593.507,76	15,63	\$ 85.746.861,11

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA
COMISION:		COMISION:	
	RESOLUCIÓN:		RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:

Acta de Iniciación de los Trabajos, 09/02/2018, fecha a partir de la cual se contarán los plazos parciales y totales para la ejecución de la obra
 Corresp. Expte. N° 16105-0015905-1 /// La Contratista presenta para su aceptación como Rpte. Técnico al Ing. Civil Luis Alberto Villalba
 • Resol. N° 1509 (21/09/2018) Corresp. Expte. N° 16105-0016385-8 /// Aprueba también el Plan de Trabajos y Curva de Invernsiones
 Corresp. Expte. N° 16105-0017470-6 /// Multa a la Contratista por \$ 370.766,77
 Resol. N° 044 (10/01/2019) Corresp. Expte. N° 16105-0017470-6 /// S/ Aplicar Multa por \$370.766,77
 Expte. 16105-0019256-2 desvincula al Ing. Luis A. Villalba , propone en su reemplazo a la Ing. Civil Patricia Gabriela Mussa desde el (01/07/19)

RUTA PROVINCIAL Nº 94		TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 8 – VILLA CAÑAS		SECCIÓN:		OBRA Nº 558	
TIPO DE OBRA:		TIPO DE OBRA:		LUNGITUD:		0	
DE LOS ANTECEDENTES				DEL CONTRATO			
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0002668-4	CONTRATO Nº:	017174	PLAZO DE CONTRATO:	12 MESES		
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	08/2019	FECHA DE CONTRATO:	5/6/2019	REPLANTEO:			
FECHA DE LICITACIÓN:	0	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	25/6/2019		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 0,00	MONTD DE CONTRATO:	\$ 146.988.910,68	VENCIMIENTO:	25/6/2020		
FINANCIAMIENTO:	0	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS			
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	1043/2019	MONTO NUEVO:	\$ 159.627.042,99	PLAZO DE AMPLIACIÓN:			
FECHA DE ADJUDIC:	0	RESOL. FECHA:	FECHA DE RECEPCIÓN	VENCIMIENTO:			
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	7,91%				
DE LA CONTRATISTA				AVANCE DE OBRA			
EMPRESA CONTRATISTA:	EDECA S.A.	INSPECTOR DE OBRA:	ING. FERNANDO BLANCO	CERTIFICACIÓN		A ORIGEN	REDETERMINADO
DOMICILIO LEGAL:	REGIS MARTÍNEZ Nº 2031	INSPECTOR ZONAL:	M.M.O. E. Leeuw	EN EL MES		\$ 29.192.084,86	\$ 44.857.270,58
REPRESENTANTE TÉCNICO:	(*) ING. CIVIL MARCELO BURGUES			ACUMULADO		\$ 127.794.550,24	\$ 246.304.527,33
				% DE EJECUCIÓN		80%	

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA


La presente documentación se refiere a las obras a realizar en el tramo de la Ruta Provincial Nº 94 que abarca desde su intersección con la Ruta Nacional Nº 8 hasta el acceso a la Localidad de Villa Cañas, previéndose un bacheo en los primeros 9.500 metros (Tramo: "R.N. Nº 8 – Fin Circunvalación Santa Isabel") y una repavimentación en los restantes 10.200 metros (Tramo: "Fin Circunvalación Santa Isabel – Acceso Villa Cañas"), totalizando un tramo de 19.700 metros.

El primer tramo en general no presenta un gran deterioro, aunque existen losas que precisan atención para restituir el confort y seguridad al conductor, por lo que se prevén tareas de bacheo de Hormigón en las mismas, manteniendo el ancho existente de 7,00m.

DISEÑO ESTRUCTURAL

- Carpetas de Concreto Asfáltico Modificado con polímeros AM3 en Callejón de 4 cm de espesor y 6,50 m de ancho, según ETP.
- Riego de liga con emulsión catiónica modificada tipo CRRM-0 a razón de 0,0005 m³/m² en 6,90 m de ancho, según ETP.
- Geotextil a colocar coincidente con juntas en un ancho de 50 cm a cada lado de éstas, según ETP.
- Base de Restitución de gallo de Concreto Asfáltico Convencional en callejón de 6 cm de espesor y 7,00 m de ancho, según ETP.
- Riego de liga con emulsión catiónica modificada tipo CRRM-0 a razón de 0,0005 m³/m² en 7,00 m de ancho, según ETP.
- Pavimento Rígido existente a mantener.
- Riego curado tipo CL-0 a razón de 0,0006 m³/m² en ancho variable según losa a reemplazar, según ETP.
- Estabilizado granular con agregado pétreo grueso, fino y cemento de 30 cm de espesor y ancho variable según losa a reemplazar, según ETP.
- Subbase de Estabilizado granular en 30 cm de espesor, con incorporación de la trituración de las losas demolidas en su composición.
- Catce de banquetas, según ETP.

CROQUIS DE UBICACIÓN

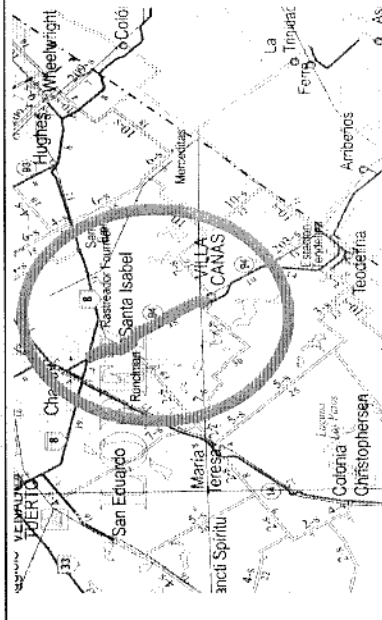

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



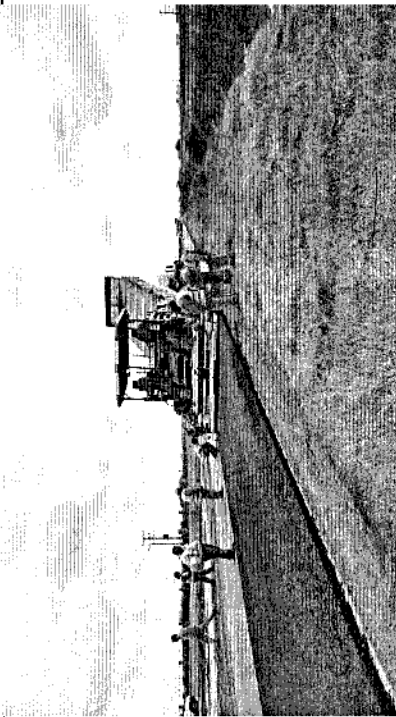


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

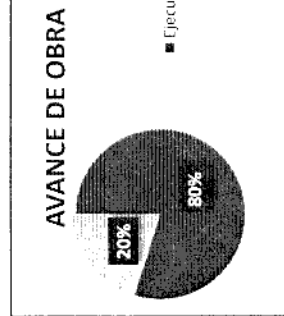

RUTA PROVINCIAL N° 94

RAMO: RUTA NACIONAL N° 8 - VILLA CAÑAS

Hoja N° 558

TIPO DE OBRA:

LONGITUD:

DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°:	16108-0002668-4	CONTRATO N°:	017174	PLAZO DE CONTRATO:	12 MESES
LICITACIÓN PÚBLICA N°:	08/2019	FECHA DE CONTRATO:	5/6/2019	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:		CONVENIO N°:		INICIACIÓN:	25/6/2019
PRESUPUESTO OFICIAL:		MONTO DE CONTRATO:	\$ 146.998.910,68	VENCIMIENTO:	25/6/2020
FINANCIAMIENTO:	1043/2019				
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:					
FECHA DE ADJUDIC:					
INTEGRANTES COMISIÓN:					
DE LA CONTRATISTA					
EMPRESA CONTRATISTA:	EDECA S.A.	INSPECTOR DE OBRA:	ING. FERNANDO BLANCO		
DOMICILIO LEGAL:	REGIS MARTÍNES N° 2031	INSPECTOR ZONAL:			
REPRESENTANTE TÉCNICO:	(*) ING. CIVIL MARCELO BURGUES				

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0019171-4	PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES ADAPTADO AL INICIO	12 MESES	25/6/2020	312 (26/05/20)
16105-0019959-8	ADECUACIÓN PLAN TRABAJOS	-	25/6/2020	470 (22/06/20)
16105-0020204-3	ADECUACIÓN PLAN TRABAJOS	90 DÍAS	23/9/2020	663 (11/08/20)
16105-0020289-2	AMPLIACIÓN DE PLAZO (6 Meses)	6 Meses	23/3/2021	1170 (27/10/20)
16105-0020430-6				

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0019825-6	600 (28/07/20)	\$ 12.628.132,31	8,59	\$ 159.627.042,99

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA
COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:

(*) EXPEDIENTE N° 16105-0019167-7 PROPONE AL ING. CIVIL MARCELO BURGUES COMO REPRESENTANTE TÉCNICO (ACEPTADO)



OBRA: "AUTOPISTA AP-01 ROSARIO - SANTA FE - TERCERA ETEPA -"		TRAMO: SENTIDO DESCENDENTE ENT "M. 32+000 Y KM. 100+000"		SECCIÓN:	OBRA Nº
TIPO DE OBRA:		TIPO DE OBRA:		LONGITUD:	0
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0002306-7	CONTRATO Nº:	016794	PLAZO DE CONTRATO:	10 (Diez) meses
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	34/2018	FECHA DE CONTRATO:	24/1/2019	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:	0	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	6/3/2019
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 960.879.253,32	MONTO DE CONTRATO:	\$ 957.700.000,00	VENCIMIENTO:	1/1/2020
FINANCIAMIENTO:	0	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS	
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	2082	MONTO NUEVO:	\$ 957.700.000,00	PLAZO DE AMPLIACIÓN:	
FECHA DE ADJUDIC:	27/12/18	RESOL. FECHA:	FECHA DE RECEPCIÓN	VENCIMIENTO:	
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	0,00%		
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN		AVANCE DE OBRA	
EMPRESA CONTRATISTA:	S.A. - LAROMET S.A. - INAR VIAL S.A. - AUTOPISTA AP	INSPECTOR DE OBRA:	0	CERTIFICACIÓN	REDETERMINADO
DOMICILIO LEGAL:	Francia Nº 1618 (Santa Fe - Capital)	INSPECTOR ZONAL:	M.M.O. E. Leeuw	EN EL MES	\$ 98.810.762,41
REPRESENTANTE TÉCNICO:	G. CIVIL DANTE SARNO (EXPTE. 16105-0018362-3), ACEPTAD			ACUMULADO	\$ 1.713.899.920,00
				% DE EJECUCIÓN	60%

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

DISEÑO ESTRUCTURAL Tramo Prog.141+000 a Prog.156+100 Calzada Ascendente:


- Carril lento:
- Fresado del pavimento existente en 0.05m de espesor.
 - Reciclado en 0.35m de espesor.
 - Base de concreto asfáltico en caliente en 0.09m de espesor.
 - Carpeta de concreto asfáltico en caliente con AM3 en 0.04m de espesor.
- Carril rápido:
- Fresado del pavimento existente en 0.05m de espesor.
 - Bacheo profundo con reciclado o bacheo con asfalto en caso de ser necesario.
 - Base de concreto asfáltico en caliente en 0.09m de espesor.
 - Carpeta de concreto asfáltico en caliente con AM3 en 0.04m de espesor.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra contempla la reparación y repavimentación de un tramo de la Autopista AP01, la que formara parte de una serie de intervenciones necesarias a fines de lograr la seguridad y el confort que corresponde a una vía de esta jerarquía.

En esta tercera etapa se prevén bacheos superficiales y profundos, fresado del carril lento y rápido, sellados de fisuras y repavimentación del carril lento y del carril rápido con distintos espesores de concreto asfálticos.

CROQUIS DE UBICACIÓN

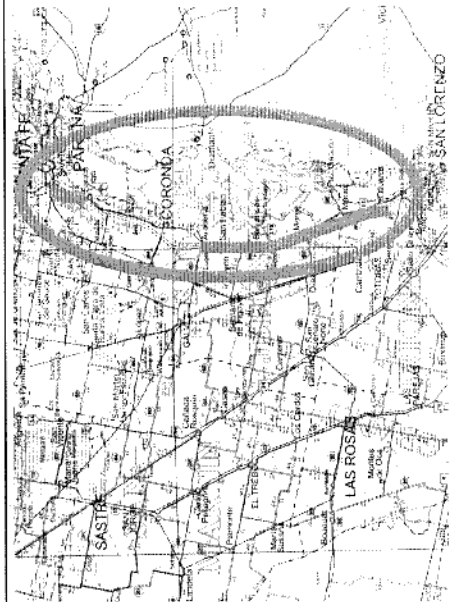

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA


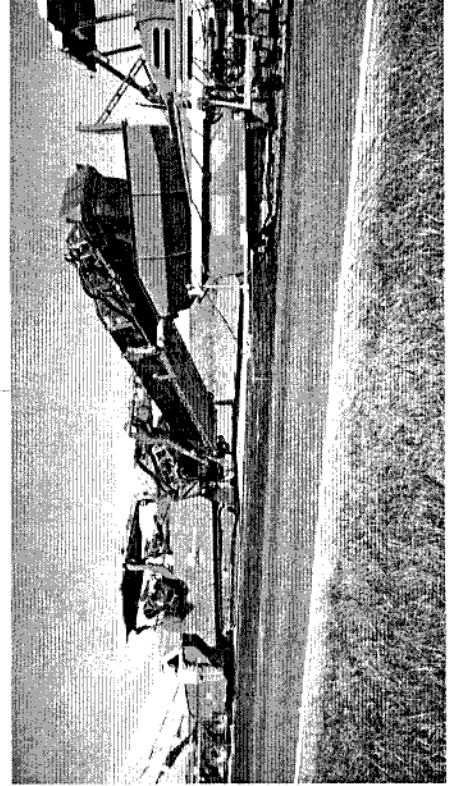


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA



OBRA: "AUTOPISTA AP-01 ROSARIO - SANTA FE - TERCERA ETAPA - " SECCI : Hoja N° 549

TIPO DE OBRA: LONGITUD:

DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°:	16108-0002306-7	CONTRATO N°:	016794	PLAZO DE CONTRATO:	10 (Diez) meses
LICITACIÓN PÚBLICA N°:	34/2018	FECHA DE CONTRATO:	24/1/2019	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:		CONVENIO N°:		INICIACIÓN:	6/3/2019
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 960.879.253,32	MONTO DE CONTRATO:	\$ 957.700.000,00	VENCIMIENTO:	1/1/2020
FINANCIAMIENTO:	2082				
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	27/12/18				
FECHA DE ADJUDIC:					
INTEGRANTES COMISIÓN:					

DE LA CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATISTA: JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - LAROMET S.A. - INAR VIAL S.A. -
 AUTOPISTA AP01 UNION TRANSITORIA

DOMICILIO LEGAL: Francia N° 1618 (Santa Fe - Capital)

REPRESENTANTE TÉCNICO: ING. CIVIL MATÍAS ALBERTO CÓRDOBA (EXPTE. 16105-0020195-2)

INSPECTOR DE OBRA:
 INSPECTOR ZONAL:

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0018401-3	INICIO DE LOS TRABAJOS	10 MESES	6/1/2020	
16105-0019173-6	READECUACIÓN TRABAJOS (C.R. N° 1)	6 MESES	6/7/2020	1985 (26/09/19)
16105-0019328-4	READECUACIÓN TRABAJOS (C.R. N° 2)	-	6/7/2020	426 (18/06/20)
16105-0020209-8	2° AMPLIACIÓN DE PLAZO	16 MESES	6/11/2021	

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0018819-0	1465 (28/06/19)	\$ 0,00	0,00	\$ 957.700.000,00
16105-0019806-1	2398 (10/12/19)	\$ 0,00	0,00	\$ 957.700.000,00

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN
16105-0019864-7	19/11/2019		
(*) PARCIAL ETAPA 1			
COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES: EXPTE. 16105-0020195-2 TRAMITA REPRESENTANTE TECNICO ING. CIVIL MATIAS ALBERTO CÓRDOBA (ACEPTADO)

(*) SE RECIBEN LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CUADRO DE REAJUSTE N° 1 - PROG. 100-000 A 97+588 (6,28% CON RESPECTO AL MONTO DE CONTRATO) (SEGÚN INSPECCIÓN)



OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 1		TRAMO: R.N. Nº168 - San José del Rincón		SECCIÓN:		OBRA Nº 517	
TIPO DE OBRA: Pavimentación de calles colectoras, ejecución de obras complementarias y la inclusión de ciclovia		LONGITUD: 6.650 mts.		DPTO.: La Capital			
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS			
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0002166-7	CONTRATO Nº:	016055	PLAZO DE CONTRATO:	15 meses		
LICITACIÓN PÚBLICA Nº:	50/2017	FECHA DE CONTRATO:	15/5/2018	REPLANTEO:			
FECHA DE LICITACIÓN:	06/02/2018	CONVENIO Nº:		INICIACIÓN:	5/6/2018		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 392.314.719,75	MONTÓ DE CONTRATO:	\$ 411.930.455,75	VENCIMIENTO:	5/9/2019		
FINANCIAMIENTO:	Fondos propios	CUADRO DE REAJUSTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS			
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	422	MONTO NUEVO:	\$ 411.930.455,75	PLAZO DE AMPLIACIÓN:			
FECHA DE ADJUDIC:	04/04/2018	RESOL. FECHA:	0	VENCIMIENTO:			
INTEGRANTES COMISION:		% DE MODIFICACIÓN:	0,00%				
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN		AVANCE DE OBRA			
EMPRESA CONTRATISTA:	Bemyc S.A. - Mundo Construcciones S.A. - Pose S.A. (U.T	CERTIFICACIÓN		A ORIGEN	REDETERMINADO		
DOMICILIO LEGAL:	Padre Genesio Nº 888 - Ciudad de Santa Fe	EN EL MES	Ing. Ramiro Rinaldi	\$ 14.755.906,13	\$ 34.929.658,23		
REPRESENTANTE TÉCNICO:	0	INSPECTOR ZONAL:	M.M.O. E. Leeuw	\$ 274.730.074,71	\$ 1.005.810.593,80		
		% DE EJECUCIÓN		67%			

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

DISEÑO ESTRUCTURAL

Perfil TIPO de calles Colectoras

La obra consiste en la pavimentación de las calles colectoras, la ejecución de las obras complementarias correspondientes al sistema de captación y conducción de los drenajes superficiales que no fueron ejecutados en el MÓDULO I y la ejecución de una ciclovia pavimentada.

El paquete estructural se compone de una base de suelo cemento de 0.15 m de espesor y una carpeta rígida de Hormigón H-30 en 0.18 m. de espesor.

Los desagües se construyen de con H"A y con mampostería en 30 cm. de espesor, alturas y anchos variables de acuerdo al diseño hídrico. Muchas veces, el coronamiento del mismo sirve como Ciclovía. Las mismas, se materializan en 1.50 m. o 2.10 m. de ancho, de acuerdo al tramo donde se encuentran emplazadas.

Se prevé la forestación con especies autóctonas, el reacondicionamiento del sistema de semafización, etc.

CROQUIS DE UBICACIÓN

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

■ Ejecutado = A Ejecutar

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
24
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Ejecutado = A Ejecutar

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 1 **SECCI.** Hoja N° 517

COMANDO: R.N. N°168 - San José del Rincón **Módulo II**

TIPO DE OBRA: Pavimentación de calles colectoras, ejecución de obras complementarias y la inclusión de ciclovia

LONGITUD: 6.650 mts. DPTO.: La Capital

DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°:	16108-0002166-7	CONTRATO N°:	016055	PLAZO DE CONTRATO:	15 meses
LICITACIÓN PÚBLICA N°:	50/2017	FECHA DE CONTRATO:	15/5/2018	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:	06/02/2018	CONVENIO N°:		INICIACIÓN:	5/6/2018
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 392.314.719,75	MONTO DE CONTRATO:	\$ 411.930.455,75	VENCIAMIENTO:	5/9/2019
FINANCIAMIENTO:	Fondos propios				
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	422				
FECHA DE ADJUDIC:	04/04/2018				
INTEGRANTES COMISIÓN:					

DE LA CONTRATISTA
 EMPRESA CONTRATISTA: Coemyc S.A. - Mundo Construcciones S.A. - Pose S.A. (U.T.)
 DOMICILIO LEGAL: Padre Genesio N° 888 - Ciudad de Santa Fe
 REPRESENTANTE TÉCNICO:
DE LA INSPECCIÓN
 INSPECTOR DE OBRA: Ing. Ramiro Rinaldi
 INSPECTOR ZONAL: Tec. Ricardo Benedetti

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIAMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0016539-5	Acorde al Inicio de los Trabajos	15 meses	5/9/2019	
16105-0017230-6	Readecuación Plan de Trabajos	15 meses	5/9/2019	
16105-0017767-7	Readecuación Plan de Trabajos	15 meses	5/9/2019	
16105-0019327-3		9 meses	5/6/2020	1918 (12/09/19)
16105-0020336-3	OBRA NEUTRALIZADA A PARTIR DE 01/02/20			
16105-0020333-0	ACTA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS (05/06/20) Ampliación de Plazo	13 meses	5/7/2021	662 (11/08/20)

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
16105-0018876-5	1616 (29/07/19)	\$ 0,00	0,00	\$ 411.930.455,75

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN
COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:



OBRA: CIRCUNVALACION DE CACTE		TRAMO: TA PROV. Nº 64 - RUTA PROV. Nº 13		SECC ^o N:	OBRA Nº
TIPO DE OBRA:		TIPO DE OBRA:		LONGITUD:	3,5 Km.
DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO			
EXPEDIENTE ADJUDIC. Nº:	16108-0002478-9	CONTRATO Nº:	016923	PLAZO DE CONTRATO:	08 MESES
LICITACION PÚBLICA Nº:	44/2018	FECHA DE CONTRATO:	13/3/2019	REPLANTEO:	3/4/2019
FECHA DE LICITACION:	14/11/18	CONVENIO Nº:		VENCIMIENTO:	3/12/2019
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 105.714.650,78	MONTO DE CONTRATO:	\$ 120.690.000,42	AMPLIACIÓN DE PLAZOS	
FINANCIAMIENTO:	0	MONTO NUEVO:	\$ 130.922.411,91	PLAZO DE AMPLIACIÓN:	
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	498/19	RESOL. FECHA:	2394 (10/12/19)	VENCIMIENTO:	
FECHA DE ADJUDIC:	28/02/19	% DE MODIFICACIÓN:	7,82%		
INTEGRANTES COMISION:		AVANCE DE OBRA			
DE LA CONTRATISTA		DE LA INSPECCIÓN		CERTIFICACIÓN	REDETERMINADO
EMPRESA CONTRATISTA:	LAROMET S.A.	INSPECTOR DE OBRA:	TEC-ALBERTO ALBA	EN EL MES	\$ 3.251.007,97
DOMICILIO LEGAL:	0	INSPECTOR ZONAL:	TEC- RICARDO BENEDETTI	ACUMULADO	\$ 217.475.218,42
REPRESENTANTE TÉCNICO:	0			% DE EJECUCIÓN	30%

RESUMEN DE MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA


La presente documentación refiere a la Obra de pavimentación del Desvío de Tránsito Pesado que circunvala la localidad de Sastre, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 64 y la Ruta Provincial Nº 13, Departamento San Martín, en el centro oeste de la Provincia.

El tramo se desarrolla en dirección norte-sur desde la Ruta Provincial Nº 64 (Prog. 0+000), en una longitud de un kilómetro, en donde se produce una curva con un ángulo de 90°, cambiando a sentido oeste-este, hasta llegar a la intersección con la R.P. Nº 13, en el final del tramo (Prog. 3+519), con un desarrollo aproximado de 3,5 km.

DISEÑO ESTRUCTURAL

- 1 - Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 6 cm de espesor y 7,30m de ancho.
 - 2 - Riego de liga con emulsión asfáltica catiónica tipo CRR-0 (0,0005 m3/m2).
 - 3 - Riego de curado con emulsión asfáltica catiónica tipo CL-0 (0,0008 m3/m2).
 - 4 - Base de estabilizado granular cementado de 15 cm de espesor y 7,60 m de ancho.
 - 5 - Riego de liga con emulsión asfáltica catiónica tipo CRR-0.
 - 6 - Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica tipo CL-0 (0,0012 m3/m2).
 - 7 - Sub-base de Suelo - Cal de 23 cm de espesor y 7,75m de ancho.
 - 8 - Subrasante escarificada y recompactada en 0,30m de espesor.
- Esta estructura estará asentada sobre un terraplén con compactación especial según Especificaciones Técnicas y/o sobre suelo natural donde aquel no exista.

CROQUIS DE UBICACIÓN

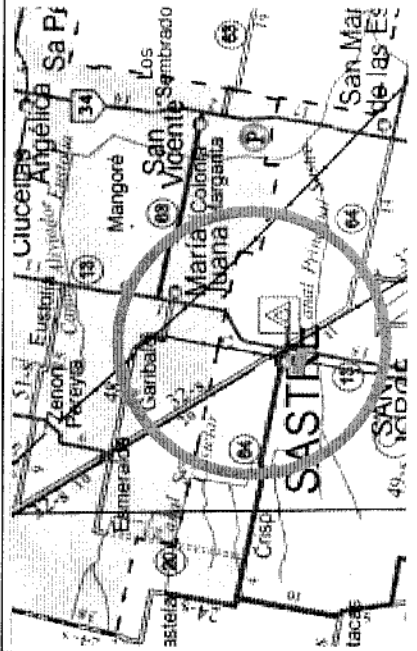

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA


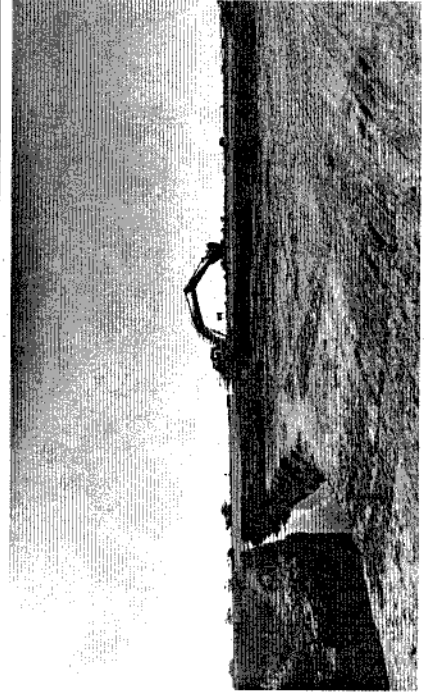


GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA



TRAMO: RUTA PROV. N° 64 - RUTA PROV. N° 13 SECCIÓN:

OBRA: CIRCUNVALACIÓN DE SASTRE

TIPO DE OBRA:

LONGITUD:

DE LOS ANTECEDENTES		DEL CONTRATO		DE LOS PLAZOS	
EXPEDIENTE ADJUDIC. N°:	16108-0002478-9	CONTRATO N°:	016923	PLAZO DE CONTRATO:	08 MESES
LICITACIÓN PÚBLICA N°:	44/2018	FECHA DE CONTRATO:	13/3/2019	REPLANTEO:	
FECHA DE LICITACIÓN:	14/11/18	CONVENIO N°:		INICIACIÓN:	3/4/2019
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 105.714.650,78	MONTO DE CONTRATO:	\$ 120.690.000,42	VENCIMIENTO:	3/12/2019
FINANCIAMIENTO:	498/19				
RESOLUCIÓN DE ADJUDIC:	28/02/19				
FECHA DE ADJUDIC:					
INTEGRANTES COMISION:					

DE LA CONTRATISTA

LAROMET S.A.

EMPRESA CONTRATISTA:

DOMICILIO LEGAL:

REPRESENTANTE TÉCNICO:

INSPECTOR DE OBRA:

INSPECTOR ZONAL:

TEC. RICARDO BENEDETTI

DE LA INSPECCIÓN

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

EXPEDIENTE	MOTIVOS	PLAZO	VENCIMIENTO	RESOLUCIÓN
16105-0018848-8	PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN ADAPTADO AL INICIO (03/04/19)	8 MESES	3/12/2019	
16105-0019427-2		6 MESES	3/6/2020	031 (07/02/20)
16105-0019974-9	ADECUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS	6 MESES	3/6/2020	311 (26/5/2020)
16105-0020535-0	ACTA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECEEL DÍA 17/09/20	6 MESES	17/3/2021	

DE LOS CUADROS DE REAJUSTES

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO
1605-0019613-3	2394 (10/12/19)	\$ 10.232.411,49	8,48	\$ 130.922.411,91

DE LAS REDETERMINACIONES DE PRECIOS

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	IMPORTE	%	MONTO ACTUALIZADO

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA

DE LA PROVISORIA		DE LA DEFINITIVA	
EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN APROBATORIA
COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:	COMISIÓN:	RESOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional"

CORRESPONDE A EXPTE. N° 02001-0050315-5

REF.: "CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA."; NOTA N° 30333/20 PEDIDO DE INFORME S/TAREAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE INVERSIONES Y EL DETERIORO PREMATURO DE LAS OBRAS VIALES.-

**SEÑOR
INGENIERO JEFE:**

En cumplimiento a lo requerido por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y conforme lo dispuesto a fs. 7, esta Dirección General de Obras dentro del ámbito de su competencia cumple en aportar Planilla Resumen de cada obra en ejecución detallada en fjs. 2/3 de autos; a excepción de las descriptas en los puntos c), k) e i).

A su conocimiento y fines correspondientes.-

Dcción Gral de Obras;
CAOBRAS\TEXTOS\558\jefe 02001-0050315-5.doc
18-11-20

Téc. RICARDO BENEDETTI
SUB-DIRECTOR DE OBRAS (INT.)
Direc. Gral. de Obras (D.P.V.)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
MESA DE ENTRADAS

20 NOV 2020

Expte. N°:.....
Recibí original con..... fs.
Hora:.....



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional"


26 NOV 2020


CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº02001-0050315-5

Sr.
Administrador General de la D.P.V.
OSCAR ENRIQUE CESCHI
S _____ / _____ D:

Con lo actuado precedentemente por la Dirección General de Obras y atento a lo solicitado en autos, se elevan las presentes a esa Superioridad para conocimiento y fines estime corresponder, sugiriendo la remisión de las mismas, salvo mejor opinión en contrario, al **Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat** a sus fines.

Atentamente.


Rig. FEDERICO B. AVALO
INGENIERO JEFE
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE



"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



PROVINCIA
DE SANTA FE

CORRESPONDE A EXPEDIENTE N.º 02001-0050315-5

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional" 01 DIC 2020

Con lo informado por la dependencia competente del Organismo, remítase al **Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat** para la intervención de su competencia.

Supla la presente de atenta nota de estilo.

A.B.



SR. OSCAR CESCHI
ADMINISTRADOR GENERAL
Provincia Provincial de Vialidad
SANTA FE

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat



Corresponde Expte. N° 02001-0050315-5.

*Atento a lo solicitado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a foja 2, y en orden a lo informado por la Dirección Provincial de Vialidad, elévense los autos a la **Secretaría Privada de la señora Ministra**, para su conocimiento, sugiriendo su posterior derivación a la señora Ministra del M.I.S.P.yH. a idénticos fines, quien de aprobar lo actuado, dará traslado de los mismos a la Subsecretaría de Asuntos Legislativos (Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad).*

Atentamente.

SANTA FE, 03 de Diciembre de 2020.

Pa. ALEJANDRA MARCELA GARCÍA
Directora General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat



Expte: 02001-0050315-5

Ref.: Nota 30333 pedido de informe s/ las tareas que se están realizando para evitar la pérdida de inversiones y el deterioro prematuro de las obras viales

Atento a lo solicitado por la **Honorable Cámara de Diputados** de la provincia de Santa Fe mediante comunicación Nro 25094/20 y habiendo tomando conocimiento de lo informado por la *Dirección Provincial de Vialidad*, remítanse los presentes autos a la **Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos**

Sirva la presente de atenta nota de remisión

C.P.N. SILVINA FRANA
Ministra
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
Provincia de Santa Fe

Secretaría Privada

3 de Febrero 2649 - c/í. 6, (S9000DEE) SANTA FE
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar



NOTA N.º - 19365


Santa Fe 28 de septiembre 2021

Referencia: Expte Nro.02001-0050315-5

Sr. Presidente de la
Cámara de Diputados y Diputadas
Provincia de Santa Fe
Dr. Pablo Farias.
S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle la respuesta al
proyecto de comunicación aprobado bajo el N° 39531 CD

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.



Dra. MARCELA AEBERHARD
Subsecretaria de Asuntos Legislativos
Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos
