



Provincia de Santa Fe  
Ministerio de Gobierno, Justicia  
y Derechos Humanos  
Subsecretaría de Asuntos Legislativos  
Dir. Pcial. de Asuntos Legislativos


NOTA N° 43917  
SANTA FE "Cuna de la Constitución Nacional" 13/05/2022  
REF.:Comunic 28171/22


Señora:  
**MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de hacerle llegar fotocopia autenticada de la Comunicación de referencia, aprobada por la H. Cámara de  
**DIPUTADOS**

.....  
Su respuesta a la presente, será remitida por intermedio de esta Dirección a la H. Cámara de origen.

Salúdole muy atentamente

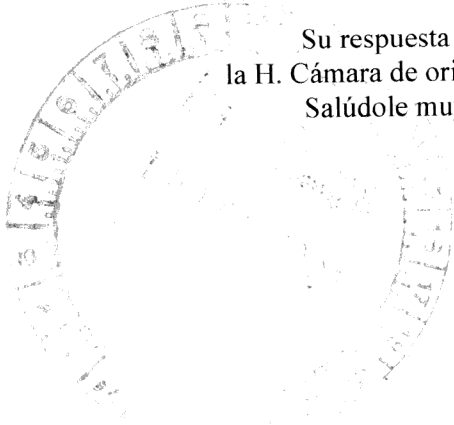

  
MARCELINO E. LAGO  
DIRECTOR PROVINCIAL DE  
ASUNTOS LEGISLATIVOS  
Subsecretaría de Asuntos Legislativos - Gobierno, Justicia y Derechos Humanos



**CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**



**SANTA FE, 20 de abril de 2022.**

Al señor  
Gobernador de la Provincia  
C.P.N. Omar PEROTTI  
**SU DESPACHO**

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gobernador llevando a su conocimiento que esta Cámara de Diputados, en sesión de la fecha, ha aprobado la Comunicación **N° 44149 CD**), cuyo texto a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre la ejecución de la obra del nuevo Palacio de Justicia de Santa Fe lindante al actual edificio de Tribunales de la Ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, en un plazo no mayor de quince (15) días- los siguientes:

- a) los avances de la ejecución de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Santa Fe lindante al actual edificio de Tribunales;
- b) monto total presupuestado;y,
- c) monto ejecutado según el avance de la misma, hasta la actualidad.”

Salúdale muy atentamente.



LIC. GUSTAVO PUCCHINI  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
CÁMARA DE DIPUTADOS

COPIA

MARTA BORGARELLO  
JEFE DE DEPARTAMENTO



Provincia de Santa Fe  
Ministerio de Infraestructura,  
Servicios Públicos y Hábitat



**CORRESPONDE EXPTE. N° 02001-0060875-9.**

*Atento a la presentación obrante a foja 2 en la que la Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que estime corresponder, se informe sobre la ejecución de la obra del nuevo Palacio de Justicia de Santa Fe lindante al actual edificio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe – Dpto. La Capital, en un plazo no mayor de quince (15) días, lo detallado en los puntos a), b) y c), corresponde se eleven las presentes actuaciones a la **Secretaría Privada de la señora Ministra** para su conocimiento, sugiriéndose su posterior remisión a la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, para su intervención e informe.*

*Atentamente.*

**SANTA FE, 03 de Junio de 2022.**

FOLIO N° 3  
CASA DE GOBIERNO



PROVINCIA DE SANTA FE



Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 06 de junio de 2022.-

**Expte:** 02001-0060875-9

**Ref.:** PEDIDO DE INFORME SOBRE LA OBRA DEL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA

Atento a las constancias de autos y habiéndose impuesto del contenido, pase a la **Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería**, a fin de que, por el organismo que corresponda, sirva realizar informe respecto de lo solicitado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe

Hecho, vuelvan las actuaciones a esta Secretaría Privada

Sirva la presente de atenta nota.

  
Patricia Degano  
Coord. Gral. Sec. Privada  
INFRAESTRUCTURA, SS. PÚBLICOS Y HABITAT  
Gobierno de Santa Fe

---

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"  
"2022 - BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"

Secretaría Privada  
3 de Febrero 2649 - Oficina 6 - Santa Fe  
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: [privmop@santafe.gov.ar](mailto:privmop@santafe.gov.ar)



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería



Santa Fe, 29 de Junio de 2022.-

Dirección Provincial  
Di.P.A.I. – M.I.S.P.y H. – SANTA FE  
Arq. Ileana Rossi Seluy  
S / D

Ref.: Expte. Nº 02001-0060875-9  
S/NOTA Nº43917: PEDIDO DE INFORME  
SOBRE LA OBRA DEL NUEVO PALACIO DE  
JUSTICIA

Atento el pedido efectuado a fs.02 cabe informar según nuestras registraciones e información disponible a la fecha, las obras en relación al nuevo Palacio de Justicia de Santa Fe son las detalladas en forma subsecuente:

Obra: "CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - PALACIO DE JUSTICIA II - ETAPA I - SANTA FE" – Decreto de adjudicación Nº 3801/15


- a) Avance a la fecha: 100% - Recep. Definitiva aprobada por Res. Nº632 de fecha: 05/10/22
- b) Presupuesto de Obra: \$115.985.472,25.-
- c) Monto ejecutado a la fecha: \$115.985.472,25.-


Obra: "Obra complementaria Nº1 - CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - PALACIO DE JUSTICIA II - ETAPA I - SANTA FE" – Decreto de adjudicación Nº 1811/18

- a) Avance a la fecha: 100% - Recep. Definitiva aprobada por Res. Nº050 de fecha: 18/01/22
- b) Presupuesto de Obra: \$ 27.539.012,22.-
- c) Monto ejecutado a la fecha: \$ 27.539.012,22.-

Así mismo se adjuntan, en ambos casos, las planillas resumen donde constan los pagos de las Certificaciones emitidas de Obra Basica y de Ajuste por Redeterminación de Precios.

Es todo cuanto cabe informar por esta Sub-Dirección.

  
Ing. LUIS E. RAMIREZ  
Subdirector de Control  
de Gestión Técnica  
U. Central - Santa Fe - DIPA - MISP y H

  
M.M.O. GABRIEL AMOR VENEZIANO  
Subdirector de Control de Gestión Técnica  
DIPA - MISP y H

"2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"  
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
F. Miguenz 180 3º Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990  
Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503  
dipa.mon@centro.gov.ar

# PROVINCIA DE SANTA FE

Obra: "CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - PALACIO DE LA JUSTICIA II - ETAPA I - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL"

Contratista: COCYAR S.A

Fecha de Licitación: 14-jul-2015 Adjudicación: DECRETO 3801 del 03/11/15

Presupuesto de Contrato: \$ 115.985.472,25


Fecha de Inicio: 15-dic-2015 Plazo de Obra: 900 DIAS

- Monto Redeterminado Octubre/15 \$ 124.064.970,96 - Aprobada por Resolución N° 201 del 04/05/2016
- Monto Redeterminado Enero/16 \$ 139.882.411,70 - Indices Precios por Resolución N° 108 del 21/03/2016 Aprobada por Resolución N° 130 del 21/03/2016
- Monto Redeterminado Abril/16 \$ 155.038.017,67 - Indices Precios por Resolución N° 302 del 29/06/2016 - Aprobada por Resolución N° 119 del 20/03/2018
- Monto Redeterminado Julio/16 \$ 162.481.659,16 - Indices Precios por Resolución N° 453 del 27/09/2016 - Aprobada por Resolución N° 120 del 20/03/2018
- Monto Redeterminado Octubre/16 \$ 172.470.151,50 - Indices Precios por Resolución N° 627 del 23/12/2016 - Aprobada por Resolución N° 014 del 21/12/2017
- Monto Redeterminado Enero/17 \$ 180.691.988,32 - Indices Precios por Resolución N° 106 del 23/03/2017 - Aprobada por Resolución N° 121 del 20/03/2018
- Monto Redeterminado Abril/17 \$ 191.335.882,28 - Indices Precios por Resolución N° 271 del 16/06/2017 - Aprobada por Resolución N° 021 del 19/01/2018
- Monto Redeterminado Julio/17 \$ 202.420.321,22 - Indices Precios por Resolución N° 485 del 27/09/2017
- Monto Redeterminado Octubre/17 \$ 207.253.464,73 - Indices Precios por Resolución N° 001 del 04/01/2018
- Monto Redeterminado Enero/18 \$ 218.592.025,73 - Indices Precios por Resolución N° 220 del 13/04/2018
- Monto Redeterminado Abril/18 \$ 239.125.736,97 - Indices Precios por Resolución N° 384 del 08/06/2018
- Monto Redeterminado Mayo/18 \$ 256.579.368,69 - Indices Precios por Resolución N° 421 del 05/07/2018
- Monto Redeterminado Julio/18 \$ 274.103.097,32 - Indices Precios por Resolución N° 549 del 14/09/2018
- Monto Redeterminado Agosto/18 \$ 296.608.900,90 - Indices Precios por Resolución N° 588 del 11/10/2018
- Monto Redeterminado Setiembre/18 \$ 330.528.256,77 - Indices Precios por Resolución N° 628 del 08/11/2018

Acta de Recepción Provisoria de Fecha: 20/02/2019 Aprobada por Resolución N° 546 del 27/11/2019

Acta de Recepción Definitiva de Fecha: 30/10/2019

N°	Mes	Año	Fecha	% Ejec. Acum.	Contrato	Redet. Prov. Oct/15	Redet. Prov. Enero/16	Redet. Prov. Abril/16	Redet. Prov. Julio/16	Redet. Prov. Octubre/16	Redet. Prov. Enero/17	Redet. Prov. Abril/17	Redet. Prov. Julio/17	Redet. Prov. Octubre/17	Redet. Prov. Enero/18	Redet. Prov. Abril/18
1	Enero	2016	23-feb-16	0,79%	\$ 910.727,75											
1/1	Enero	2016	05-abr-16			\$ 62.441,70										
2	Febrero	2016	18-mar-16	1,13%	\$ 397.742,99											
2/1	Febrero	2016	18-mar-16			\$ 23.864,58										
2/2	Febrero	2016	12-oct-16				\$ 55.684,02									
3	Marzo	2016	13-abr-16	2,17%	\$ 1.202.751,06											
3/1	Marzo	2016	13-abr-16			\$ 83.923,31										
3/2	Marzo	2016	01-jun-16				\$ 168.385,15									
4	Abril	2016	23-may-16	3,63%	\$ 1.698.416,43											
4/1	Abril	2016	23-may-16			\$ 109.743,82										
4/2	Abril	2016	22-ago-16				\$ 237.778,30									
5	Mayo	2016	15-jun-16	5,43%	\$ 2.083.743,05											
5/1	Mayo	2016	15-jun-16			\$ 132.790,98										
5/2	Mayo	2016	22-ago-16				\$ 290.632,54									
5/3	Mayo	2016	12-oct-16					\$ 280.683,17								
6	Junio	2016	18-jul-16	8,26%	\$ 3.284.164,86											
6/1	Junio	2016	18-jul-16				\$ 674.892,18									
6/2	Junio	2016	24-ago-16					\$ 439.986,93								
7	Julio	2016	11-ago-16	11,29%	\$ 3.512.624,73											
7/1	Julio	2016	11-ago-16				\$ 721.614,38									
7/2	Julio	2016	24-ago-16					\$ 472.431,73								
8	Agosto	2016	15-sep-16	13,95%	\$ 3.085.410,95											
8/1	Agosto	2016	15-sep-16				\$ 1.047.326,65									
8/2	Agosto	2016	25-oct-16					\$ 189.715,00								
9	Septiembre	2016	12-oct-16	16,56%	\$ 3.027.588,42											
9/1	Septiembre	2016	12-oct-16				\$ 1.025.765,98									
9/2	Septiembre	2016	21-nov-16					\$ 182.506,88								
10	Octubre	2016	10-nov-16	19,13%	\$ 2.986.686,54											
10/1	Octubre	2016	10-nov-16					\$ 1.191.272,95								
11	Noviembre	2016	13-dic-16	21,73%	\$ 3.010.493,99											
11/1	Noviembre	2016	13-dic-16					\$ 1.200.342,62								
11/2	Noviembre	2016	15-feb-17					\$ 254.443,51								
12	Diciembre	2016	18-ene-17	24,95%	\$ 3.740.189,73											
12/1	Diciembre	2016	18-ene-17					\$ 1.508.273,63								
12/2	Diciembre	2016	15-feb-17					\$ 325.174,78								
13	Enero	2017	18-feb-17	29,01%	\$ 4.706.420,45											
13/1	Enero	2017	18-feb-17					\$ 2.333.368,72								
14	Febrero	2017	10-mar-17	32,22%	\$ 3.727.344,87											
14/1	Febrero	2017	10-mar-17					\$ 1.832.604,74								
14/2	Febrero	2017	26-abr-17					\$ 265.241,74								
15	Marzo	2017	12-abr-17	35,18%	\$ 3.427.612,16											
15/1	Marzo	2017	12-abr-17					\$ 1.657.534,25								
15/2	Marzo	2017	26-abr-17					\$ 241.682,16								
16	Abril	2017	12-may-17	39,23%	\$ 4.699.150,35											
16/1	Abril	2017	12-may-17					\$ 2.616.474,77								
17	Mayo	2017	15-jun-17	43,60%	\$ 4.951.845,13											
17/1	Mayo	2017	15-jun-17					\$ 2.820.333,50								
17/2	Mayo	2017	01-ago-17					\$ 492.472,12								
18	Junio	2017	13-jul-17	47,81%	\$ 5.005.452,03											
18/1	Junio	2017	13-jul-17					\$ 2.835.483,52								
18/2	Junio	2017	23-ago-17					\$ 493.619,47								
19	Julio	2017	14-ago-17	52,19%	\$ 5.074.227,91											
19/1	Julio	2017	14-ago-17					\$ 2.878.755,53								
19/2	Julio	2017	14-nov-17					\$ 500.657,03								
20	Agosto	2017	13-sep-17	56,52%	\$ 5.022.376,82											
20/1	Agosto	2017	13-sep-17					\$ 3.349.492,48								
20/2	Agosto	2017	14-nov-17					\$ 455.880,83								
21	Septiembre	2017	13-oct-17	61,12%	\$ 5.336.205,88											
21/1	Septiembre	2017	13-oct-17					\$ 3.562.563,98								
21/2	Septiembre	2017	28-nov-17					\$ 483.951,53								
22	Octubre	2017	23-nov-17	65,53%	\$ 5.115.991,35											
22/1	Octubre	2017	23-nov-17					\$ 3.875.830,82								
23	Noviembre	2017	28-dic-17	69,97%	\$ 5.150.518,18											
23/1	Noviembre	2017	28-dic-17					\$ 3.900.104,96								
23/2	Noviembre	2017	03-may-18					\$ 208.731,17								
24	Diciembre	2017	17-ene-18	74,12%	\$ 4.809.343,52											
24/1	Diciembre	2017	17-ene-18					\$ 3.638.760,27								
24/2	Diciembre	2017	03-may-18					\$ 198.846,81								
25	Enero	2018	20-feb-18	78,01%	\$ 4.513.315,71											
25/1	Enero	2018	20-feb-18					\$ 3.400.085,63								
25/2	Enero	2018	04-jul-18					\$ 187.050,28								
26	Febrero	2018	22-mar-18	82,18%	\$ 4.832.278,05											
26/1	Febrero	2018	22-mar-18					\$ 3.631.759,38								
26/2	Febrero	2018	04-jul-18					\$ 674.314,75								
27	Marzo	2018	23-abr-18	84,79%	\$ 3.027.203,09											
27/1	Marzo	2018	23-abr-18					\$ 2.187.100,25								
27/2	Marzo	2018	04-jul-18					\$ 282.787,47								



Nº de Expediente: 00601-0047172-0

Fecha de Finalización: 01/06/2018 Contrato Nº: 14137 del 25/11/2015  
 Fecha de Neutralización: 15/12/2015 Disp. Nº 031 del 16/02/2016  
 Fecha de Reinicio: 25/01/2016  
 Nueva Fecha de Finalización: 12/07/2018  
 Nueva Fecha de Finalización: 01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016

Redet. Prov. Mayo/18	Redet. Prov. Julio/18	Redet. Prov. Agosto/18	Redet. Prov. Septiembre/18	Denominación		Total Pagado	Fondo de Reparó	Neto a Pagar	Observaciones
				Obra Básica	Adic. Nº 1				
				\$ 910.727,75		\$ 910.727,75	-\$ 45.536,39	\$ 865.191,36	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 62.441,70		\$ 62.441,70	-\$ 3.122,08	\$ 59.319,61	Certif. Redet. 1/1 Provisorio
				\$ 397.742,99		\$ 397.742,99	-\$ 19.887,15	\$ 377.855,84	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 23.864,58		\$ 23.864,58	-\$ 1.193,23	\$ 22.671,35	Certif. Redet. 2/1 Provisorio
				\$ 55.684,02		\$ 55.684,02	-\$ 2.784,20	\$ 52.899,82	Certif. Redet. 2/2 Provisorio
				\$ 1.202.751,06		\$ 1.202.751,06	-\$ 60.137,55	\$ 1.142.613,51	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 83.923,31		\$ 83.923,31	-\$ 4.196,17	\$ 79.727,15	Certif. Redet. 3/1 Provisorio
				\$ 168.385,15		\$ 168.385,15	-\$ 8.419,26	\$ 159.965,89	Certif. Redet. 3/2 Provisorio
				\$ 1.698.416,43		\$ 1.698.416,43	-\$ 84.920,82	\$ 1.613.495,61	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 109.743,82		\$ 109.743,82	-\$ 5.487,19	\$ 104.256,63	Certif. Redet. 4/1 Provisorio
				\$ 237.778,30		\$ 237.778,30	-\$ 11.888,92	\$ 225.889,39	Certif. Redet. 4/2 Provisorio
				\$ 2.083.743,05		\$ 2.083.743,05	-\$ 104.187,15	\$ 1.979.555,89	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 132.790,98		\$ 132.790,98	-\$ 6.639,55	\$ 126.151,43	Certif. Redet. 5/1 Provisorio
				\$ 290.632,54		\$ 290.632,54	-\$ 14.531,63	\$ 276.100,91	Certif. Redet. 5/2 Provisorio
				\$ 280.683,17		\$ 280.683,17	-\$ 14.034,16	\$ 266.649,02	Certif. Redet. 5/3 Provisorio
				\$ 3.284.164,86		\$ 3.284.164,86	-\$ 164.208,24	\$ 3.119.956,62	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 674.892,18		\$ 674.892,18	-\$ 33.744,61	\$ 641.147,57	Certif. Redet. 6/1 Provisorio
				\$ 439.986,93		\$ 439.986,93	-\$ 21.999,35	\$ 417.987,58	Certif. Redet. 6/2 Provisorio
				\$ 3.512.624,73		\$ 3.512.624,73	-\$ 175.631,24	\$ 3.336.993,50	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 721.614,38		\$ 721.614,38	-\$ 36.080,72	\$ 685.533,66	Certif. Redet. 7/1 Provisorio
				\$ 472.431,73		\$ 472.431,73	-\$ 23.621,59	\$ 448.810,15	Certif. Redet. 7/2 Provisorio
				\$ 3.085.410,95		\$ 3.085.410,95	-\$ 154.270,55	\$ 2.931.140,40	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.047.326,65		\$ 1.047.326,65	-\$ 52.366,33	\$ 994.960,32	Certif. Redet. 8/1 Provisorio
				\$ 189.715,00		\$ 189.715,00	-\$ 9.485,75	\$ 180.229,25	Certif. Redet. 8/2 Provisorio
				\$ 3.027.588,42		\$ 3.027.588,42	-\$ 151.379,42	\$ 2.876.209,00	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.025.765,98		\$ 1.025.765,98	-\$ 51.288,30	\$ 974.477,68	Certif. Redet. 9/1 Provisorio
				\$ 182.506,88		\$ 182.506,88	-\$ 9.125,34	\$ 173.381,51	Certif. Redet. 9/2 Provisorio
				\$ 2.986.686,54		\$ 2.986.686,54	-\$ 149.334,33	\$ 2.837.352,21	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.191.272,95		\$ 1.191.272,95	-\$ 59.563,65	\$ 1.131.709,30	Certif. Redet. 10/1 Provisorio
				\$ 3.010.493,99		\$ 3.010.493,99	-\$ 150.524,70	\$ 2.859.969,29	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.200.342,62		\$ 1.200.342,62	-\$ 60.017,13	\$ 1.140.325,49	Certif. Redet. 11/1 Provisorio
				\$ 254.443,51		\$ 254.443,51	-\$ 12.722,18	\$ 241.721,33	Certif. Redet. 11/2 Provisorio
				\$ 3.740.189,73		\$ 3.740.189,73	-\$ 187.009,49	\$ 3.553.180,24	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.508.273,63		\$ 1.508.273,63	-\$ 75.413,68	\$ 1.432.859,95	Certif. Redet. 12/1 Provisorio
				\$ 325.174,78		\$ 325.174,78	-\$ 16.258,74	\$ 308.916,04	Certif. Redet. 12/2 Provisorio
				\$ 4.706.420,45		\$ 4.706.420,45	-\$ 235.321,02	\$ 4.471.099,42	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 2.333.368,72		\$ 2.333.368,72	-\$ 116.668,44	\$ 2.216.700,28	Certif. Redet. 13/1 Provisorio
				\$ 3.727.344,87		\$ 3.727.344,87	-\$ 186.367,24	\$ 3.540.977,63	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.832.604,74		\$ 1.832.604,74	-\$ 91.630,24	\$ 1.740.974,50	Certif. Redet. 14/1 Provisorio
				\$ 265.241,74		\$ 265.241,74	-\$ 13.282,09	\$ 251.959,66	Certif. Redet. 14/2 Provisorio
				\$ 3.427.612,16		\$ 3.427.612,16	-\$ 171.380,81	\$ 3.256.231,35	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.657.534,25		\$ 1.657.534,25	-\$ 82.876,71	\$ 1.574.657,53	Certif. Redet. 15/1 Provisorio
				\$ 241.682,16		\$ 241.682,16	-\$ 12.084,11	\$ 229.598,05	Certif. Redet. 15/2 Provisorio
				\$ 4.699.150,35		\$ 4.699.150,35	-\$ 234.957,52	\$ 4.464.192,83	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 2.616.474,77		\$ 2.616.474,77	-\$ 130.823,74	\$ 2.485.651,03	Certif. Redet. 16/1 Provisorio
				\$ 4.951.845,13		\$ 4.951.845,13	-\$ 247.592,26	\$ 4.704.252,88	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 2.820.333,50		\$ 2.820.333,50	-\$ 141.016,87	\$ 2.679.316,62	Certif. Redet. 17/1 Provisorio
				\$ 492.472,12		\$ 492.472,12	-\$ 24.623,61	\$ 467.848,52	Certif. Redet. 17/2 Provisorio
				\$ 5.005.452,03		\$ 5.005.452,03	-\$ 250.272,60	\$ 4.755.179,43	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 2.835.483,52		\$ 2.835.483,52	-\$ 141.774,18	\$ 2.693.709,34	Certif. Redet. 18/1 Provisorio
				\$ 493.619,47		\$ 493.619,47	-\$ 24.680,97	\$ 468.938,49	Certif. Redet. 18/2 Provisorio
				\$ 5.074.227,91		\$ 5.074.227,91	-\$ 253.711,40	\$ 4.820.516,52	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 2.878.755,53		\$ 2.878.755,53	-\$ 143.937,78	\$ 2.734.817,75	Certif. Redet. 19/1 Provisorio
				\$ 500.657,03		\$ 500.657,03	-\$ 25.032,85	\$ 475.624,18	Certif. Redet. 19/2 Provisorio
				\$ 5.022.376,82		\$ 5.022.376,82	-\$ 251.118,84	\$ 4.771.257,98	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.349.492,48		\$ 3.349.492,48	-\$ 167.474,62	\$ 3.182.017,86	Certif. Redet. 20/1 Provisorio
				\$ 455.880,83		\$ 455.880,83	-\$ 22.794,04	\$ 433.086,79	Certif. Redet. 20/2 Provisorio
				\$ 5.336.205,88		\$ 5.336.205,88	-\$ 266.810,29	\$ 5.069.395,59	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.562.563,98		\$ 3.562.563,98	-\$ 178.128,20	\$ 3.384.435,78	Certif. Redet. 21/1 Provisorio
				\$ 483.951,53		\$ 483.951,53	-\$ 24.197,58	\$ 459.753,95	Certif. Redet. 21/2 Provisorio
				\$ 5.115.991,35		\$ 5.115.991,35	-\$ 255.799,57	\$ 4.860.191,78	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.875.830,82		\$ 3.875.830,82	-\$ 193.791,54	\$ 3.682.039,28	Certif. Redet. 22/1 Provisorio
				\$ 5.150.518,18		\$ 5.150.518,18	-\$ 257.525,91	\$ 4.892.992,27	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.900.104,96		\$ 3.900.104,96	-\$ 195.005,25	\$ 3.705.099,71	Certif. Redet. 23/1 Provisorio
				\$ 208.731,17		\$ 208.731,17	-\$ 10.436,56	\$ 198.294,61	Certif. Redet. 23/2 Provisorio
				\$ 4.809.343,52		\$ 4.809.343,52	-\$ 240.467,18	\$ 4.568.876,34	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.638.760,27		\$ 3.638.760,27	-\$ 181.938,01	\$ 3.456.822,26	Certif. Redet. 24/1 Provisorio
				\$ 198.846,81		\$ 198.846,81	-\$ 9.942,34	\$ 188.904,47	Certif. Redet. 24/2 Provisorio
				\$ 4.513.315,71		\$ 4.513.315,71	-\$ 225.665,79	\$ 4.287.649,93	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.400.085,63		\$ 3.400.085,63	-\$ 170.004,28	\$ 3.230.081,35	Certif. Redet. 25/1 Provisorio
				\$ 187.050,28		\$ 187.050,28	-\$ 9.352,51	\$ 177.697,77	Certif. Redet. 25/2 Provisorio
				\$ 4.832.278,05		\$ 4.832.278,05	-\$ 241.613,90	\$ 4.590.664,15	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.631.759,38		\$ 3.631.759,38	-\$ 181.587,97	\$ 3.450.171,41	Certif. Redet. 26/1 Provisorio
				\$ 674.314,75		\$ 674.314,75	-\$ 33.715,74	\$ 640.599,01	Certif. Redet. 26/2 Provisorio
				\$ 3.027.203,09		\$ 3.027.203,09	-\$ 151.360,15	\$ 2.875.842,94	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 2.187.100,25		\$ 2.187.100,25	-\$ 109.355,01	\$ 2.077.745,24	Certif. Redet. 27/1 Provisorio
				\$ 282.787,47		\$ 282.787,47	-\$ 14.139,37	\$ 268.648,10	Certif. Redet. 27/2 Provisorio

# PROVINCIA DE SANTA FE

Obra **CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - PALACIO DE LA JUSTICIA II - ETAPA I - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL**

Contratista **COCYAR S.A**

Fecha de Licitación: **14-jul-2015** Adjudicación: **DECRETO 3601 del 03/11/15**

Fecha de Inicio: **15-dic-2015** Presupuesto de Contrato: **\$ 115.985.472,25**

Plazo de Obra: **900 DIAS**

Fecha de Inicio: **15-dic-2015** Plazo de Obra: **900 DIAS** Fecha de Inicio Trabajos Complementarios: **01/08/2018**

Fecha Terminación Trabajos Complementarios: **27/05/2019**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **12/07/2018**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**



Fecha de Remicio: **25/01/2016**

Nueva Fecha de Finalización: **01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016**

Acta de Recepción Provisoria de Fecha: **30/08/2019**

Acta de Recepción Definitiva de Fecha: **07/05/2020**

Nº	Mes	Año	Fecha	% Ejec. Acum.	Contrato	Redet. Prov. Julio/18	Redet. Prov. Agosto/18	Redet. Prov. Septiembre/18	Redet. Prov. Diciembre/18	Redet. Prov. Marzo/19	Redet. Prov. Abril/19	Denominación	Adic. Nº1	Total Pagado	Fondo de Reparación	Neto a Pagar	Observaciones
1	Agosto	2018	24-sep-18	6,44%	\$ 1.774.742,51	\$ 2.441.895,57						Obra Básica		\$ 1.774.742,51	-\$ 88.737,13	\$ 1.863.479,64	Certificado de Obra Provisoria
1/1	Agosto	2018	18-dic-18		\$ 1.827.436,81	\$ 2.441.895,57	\$ 2.441.895,57							\$ 2.441.895,57	-\$ 122.064,78	\$ 2.319.830,79	Certif. Redet. 1/1 Provisorio
2	Septiembre	2018	26-oct-18	13,08%	\$ 2.857.758,75	\$ 2.857.758,75	\$ 2.857.758,75							\$ 2.857.758,75	-\$ 91.371,94	\$ 2.766.386,81	Certificado de Obra Provisoria
2/1	Septiembre	2018	18-dic-18		\$ 3.400.720,48	\$ 3.400.720,48	\$ 3.400.720,48							\$ 3.400.720,48	-\$ 142.887,94	\$ 3.257.832,54	Certif. Redet. 2/1 Provisorio
3	Octubre	2018	29-nov-18	25,43%	\$ 3.872.581,19	\$ 3.872.581,19	\$ 3.872.581,19							\$ 3.872.581,19	-\$ 170.036,02	\$ 3.702.545,17	Certificado de Obra Provisoria
3/1	Octubre	2018	29-nov-18		\$ 5.311.324,58	\$ 5.311.324,58	\$ 5.311.324,58							\$ 5.311.324,58	-\$ 255.565,23	\$ 5.055.759,35	Certif. Redet. 3/1 Provisorio
3/2	Octubre	2018	11-jul-19		\$ 3.872.581,19	\$ 3.872.581,19	\$ 3.872.581,19							\$ 3.872.581,19	-\$ 47.943,08	\$ 3.824.638,11	Certif. Redet. 3/2 Provisorio
4/1	Noviembre	2018	26-dic-18	39,49%	\$ 6.047.427,28	\$ 6.047.427,28	\$ 6.047.427,28							\$ 6.047.427,28	-\$ 302.371,36	\$ 5.745.055,92	Certificado de Obra Provisoria
4/2	Noviembre	2018	11-jul-19		\$ 3.401.472,76	\$ 3.401.472,76	\$ 3.401.472,76							\$ 3.401.472,76	-\$ 54.549,13	\$ 3.346.923,63	Certif. Redet. 4/1 Provisorio
5	Diciembre	2018	25-ene-19	51,84%	\$ 5.308.544,68	\$ 5.308.544,68	\$ 5.308.544,68							\$ 5.308.544,68	-\$ 170.073,64	\$ 5.138.471,04	Certificado de Obra Provisoria
5/1	Diciembre	2018	11-jul-19		\$ 4.128.151,72	\$ 4.128.151,72	\$ 4.128.151,72							\$ 4.128.151,72	-\$ 206.407,59	\$ 3.921.744,14	Certif. Redet. 5/1 Provisorio
5/2	Diciembre	2018	18-ago-19		\$ 6.442.163,86	\$ 6.442.163,86	\$ 6.442.163,86							\$ 6.442.163,86	-\$ 322.108,19	\$ 6.120.055,67	Certificado de Obra Provisoria
6/1	Enero	2019	18-ago-19	66,83%	\$ 4.435.239,30	\$ 4.435.239,30	\$ 4.435.239,30							\$ 4.435.239,30	-\$ 94.901,43	\$ 4.340.337,87	Certif. Redet. 6/1 Provisorio
6/2	Enero	2019	11-jul-19		\$ 6.921.220,48	\$ 6.921.220,48	\$ 6.921.220,48							\$ 6.921.220,48	-\$ 221.761,95	\$ 6.700.458,53	Certificado de Obra Provisoria
7	Febrero	2019	21-mar-19	82,94%	\$ 2.039.288,82	\$ 2.039.288,82	\$ 2.039.288,82							\$ 2.039.288,82	-\$ 101.964,44	\$ 1.937.324,38	Certif. Redet. 7/1 Provisorio
7/1	Febrero	2019	11-jul-19		\$ 3.391.086,08	\$ 3.391.086,08	\$ 3.391.086,08							\$ 3.391.086,08	-\$ 119.554,30	\$ 3.271.531,77	Certif. Redet. 7/2 Provisorio
8	Marzo	2019	23-abr-19	91,62%	\$ 3.732.341,46	\$ 3.732.341,46	\$ 3.732.341,46							\$ 3.732.341,46	-\$ 186.617,07	\$ 3.545.724,39	Certificado de Obra Provisoria
8/1	Marzo	2019	11-jul-19		\$ 1.098.978,34	\$ 1.098.978,34	\$ 1.098.978,34							\$ 1.098.978,34	-\$ 64.948,92	\$ 1.033.929,42	Certif. Redet. 8/1 Provisorio
8/2	Marzo	2019	27-may-19		\$ 1.371.604,03	\$ 1.371.604,03	\$ 1.371.604,03							\$ 1.371.604,03	-\$ 68.580,20	\$ 1.303.023,83	Certificado de Obra Provisoria
9	Abril	2019	27-may-19	96,60%	\$ 2.141.925,52	\$ 2.141.925,52	\$ 2.141.925,52							\$ 2.141.925,52	-\$ 107.086,28	\$ 2.034.839,23	Certificado de Obra Provisoria
9/1	Abril	2019	11-jul-19		\$ 530.026,17	\$ 530.026,17	\$ 530.026,17							\$ 530.026,17	-\$ 31.501,31	\$ 498.524,86	Certif. Redet. 9/1 Provisorio
9/2	Abril	2019	13-sep-19		\$ 315.728,86	\$ 315.728,86	\$ 315.728,86							\$ 315.728,86	-\$ 15.786,44	\$ 280.942,42	Certif. Redet. 9/2 Provisorio
9/3	Abril	2019	24-jun-19		\$ 596.027,76	\$ 596.027,76	\$ 596.027,76							\$ 596.027,76	-\$ 29.801,39	\$ 566.226,37	Certificado de Obra Provisoria
10	Mayo	2019	24-jun-19	98,77%	\$ 930.872,94	\$ 930.872,94	\$ 930.872,94							\$ 930.872,94	-\$ 46.543,65	\$ 884.329,29	Certificado de Obra Provisoria
10/1	Mayo	2019	08-oct-19		\$ 529.395,06	\$ 529.395,06	\$ 529.395,06							\$ 529.395,06	-\$ 26.469,75	\$ 492.925,31	Certif. Redet. 10/1 Provisorio
10/2	Mayo	2019	11-mar-20		\$ 339.949,60	\$ 339.949,60	\$ 339.949,60							\$ 339.949,60	-\$ 16.997,48	\$ 322.952,12	Certif. Redet. 10/2 Provisorio
11	Junio	2019	11-mar-20	100,00%	\$ 764.886,60	\$ 764.886,60	\$ 764.886,60							\$ 764.886,60	-\$ 38.244,33	\$ 726.642,27	Certif. FINAL Provisorio
11/1	Junio	2019	11-dic-20		\$ 67.989,92	\$ 67.989,92	\$ 67.989,92							\$ 67.989,92	-\$ 3.389,50	\$ 64.599,42	Certif. Redet. 11/1 Provisorio
11/2	Junio	2019	17-nov-21		\$ 27.539.012,24	\$ 2.441.895,57	\$ 3.004.864,01	\$ 5.666.321,86	\$ 1.080.615,46	\$ 587.384,98	\$ 80.023.473,67			\$ 80.023.473,67	-\$ 0,00	\$ 79.999,92	Devolución Fondos de Reparación





# PROVINCIA DE SANTA FE

Obra: "CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - PALACIO DE LA JUSTICIA II - ETAPA I - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL"

Contratista: COCYAR S.A

Fecha de Licitación: 14-jul-2015 Adjudicación: DECRETO 3801 del 03/11/15

Presupuesto de Contrato: \$ 115.985.472,25

Fecha de Inicio: 15-dic-2015 Plazo de Obra: 900 DIAS

Monto Redeterminado Octubre/15 \$ 124.064.970,96.- Aprobada por Resolución N° 201 del 04/05/2016  
 Monto Redeterminado Enero/16 \$ 139.882.411,70.- Indices Precios por Resolución N° 108 del 21/03/2016 Aprobada por Resolución N° 130 del 21/03/2018  
 Monto Redeterminado Abril/16 \$ 155.038.017,67.- Indices Precios por Resolución N° 302 del 29/06/2016 - Aprobada por Resolución N° 119 del 20/03/2018  
 Monto Redeterminado Julio/16 \$ 162.481.659,16.- Indices Precios por Resolución N° 453 del 27/09/2016 - Aprobada por Resolución N° 120 del 20/03/2018  
 Monto Redeterminado Octubre/16 \$ 172.470.151,50.- Indices Precios por Resolución N° 627 del 23/12/2016 - Aprobada por Resolución N° 014 del 21/12/2017  
 Monto Redeterminado Enero/17 \$ 180.691.988,32.- Indices Precios por Resolución N° 106 del 23/03/2017 - Aprobada por Resolución N° 121 del 20/03/2018  
 Monto Redeterminado Abril/17 \$ 191.335.882,28.- Indices Precios por Resolución N° 271 del 16/06/2017 - Aprobada por Resolución N° 021 del 19/01/2018  
 Monto Redeterminado Julio/17 \$ 202.420.321,22.- Indices Precios por Resolución N° 485 del 27/09/2017  
 Monto Redeterminado Octubre/17 \$ 207.253.464,73.- Indices Precios por Resolución N° 001 del 04/01/2018  
 Monto Redeterminado Enero/18 \$ 218.592.025,73.- Indices Precios por Resolución N° 220 del 13/04/2018  
 Monto Redeterminado Abril/18 \$ 239.125.736,97.- Indices Precios por Resolución N° 384 del 08/06/2018  
 Monto Redeterminado Mayo/18 \$ 256.579.368,69.- Indices Precios por Resolución N° 421 del 05/07/2018  
 Monto Redeterminado Julio/18 \$ 274.103.097,32.- Indices Precios por Resolución N° 549 del 14/09/2018  
 Monto Redeterminado Agosto/18 \$ 296.608.900,90.- Indices Precios por Resolución N° 588 del 11/10/2018  
 Monto Redeterminado Setiembre/18 \$ 330.528.256,77.- Indices Precios por Resolución N° 628 del 08/11/2018

Acta de Recepción Provisiona de Fecha: 20/02/2019 Aprobada por Resolución N° 546 del 27/11/2019

Acta de Recepción Definitiva de Fecha: 30/10/2019

N°	Mes	Año	Fecha	% Ejec. Acum.	Contrato	Redet. Prov. Oct/15	Redet. Prov. Enero/16	Redet. Prov. Abril/16	Redet. Prov. Julio/16	Redet. Prov. Octubre/16	Redet. Prov. Enero/17	Redet. Prov. Abril/17	Redet. Prov. Julio/17	Redet. Prov. Octubre/17	Redet. Prov. Enero/18	Redet. Pr. Abril/18
28	Abril	2018	21-may-18	88,86%	\$ 4.494.311,60											
28/1	Abril	2018	21-may-18													
28/2	Abril	2018	04-jul-18											\$ 3.363.832,54		
29	Mayo	2018	18-jun-18	92,26%	\$ 4.168.563,41											\$ 407.371,50
29/1	Mayo	2018	18-jun-18													
29/2	Mayo	2018	12-nov-18											\$ 3.231.683,80		
30	Junio	2018	23-jul-18	97,18%	\$ 5.710.501,13											\$ 1.156.000,00
30/1	Junio	2018	23-jul-18													
30/2	Junio	2018	12-nov-18												\$ 4.974.548,10	
31	Julio	2018	14-ago-18	98,79%	\$ 1.864.462,64											
31/1	Julio	2018	14-ago-18													
31/2	Julio	2018	12-nov-18												\$ 1.639.358,89	
32	Agosto	2018	24-sep-18	99,58%	\$ 914.953,63											
32/1	Agosto	2018	24-sep-18													
32/2	Agosto	2018	18-ene-19												\$ 810.722,47	
33	Septiembre	2018	23-oct-18	99,85%	\$ 314.398,94											
33/1	Septiembre	2018	23-oct-18													
33/2	Septiembre	2018	16-ene-19												\$ 276.162,40	
34	Octubre	2019	27-ago-19	100%	\$ 178.454,90											
34/1	Octubre	2019	27-ago-19													
34/2	Octubre	2019	17-feb-20													
35			13-jul-20													
					<b>\$ 115.985.472,25</b>	<b>\$ 412.764,39</b>	<b>\$ 2.148.986,57</b>	<b>\$ 3.266.194,46</b>	<b>\$ 4.272.111,08</b>	<b>\$ 6.403.126,00</b>	<b>\$ 11.657.971,22</b>	<b>\$ 8.398.805,08</b>	<b>\$ 19.386.373,42</b>	<b>\$ 9.377.244,85</b>	<b>\$ 9.065.265,58</b>	<b>\$ 1.156.000,00</b>



Nº de Expediente: 00601-0047172-0

Fecha de Finalización: 01/06/2018 Contrato Nº: 14137 del 25/11/2015  
 Fecha de Neutralización: 15/12/2015 Disp. Nº 031 del 16/02/2016  
 Fecha de Reinicio: 25/01/2016  
 Nueva Fecha de Finalización: 12/07/2018  
 Nueva Fecha de Finalización: 01/10/2018 Resolución Nº 397 del 23/08/2016


Redet. Prov. Mayo/18	Redet. Prov. Julio/18	Redet. Prov. Agosto/18	Redet. Prov. Septiembre/18	Denominación		Total Pagado	Fondo de Reparación	Neto a Pagar	Observaciones
				Obra Básica	Adic. Nº 1				
				\$ 4.494.311,60		\$ 4.494.311,60	-\$ 224.715,58	\$ 4.269.596,02	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.363.832,54		\$ 3.363.832,54	-\$ 168.191,63	\$ 3.195.640,91	Certif. Redet. 28/1 Provisorio
				\$ 407.371,50		\$ 407.371,50	-\$ 20.368,57	\$ 387.002,92	Certif. Redet. 28/2 Provisorio
				\$ 4.168.563,41		\$ 4.168.563,41	-\$ 208.428,17	\$ 3.960.135,24	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 3.231.683,80		\$ 3.231.683,80	-\$ 161.584,19	\$ 3.070.099,61	Certif. Redet. 29/1 Provisorio
				\$ 1.156.000,62		\$ 1.156.000,62	-\$ 57.800,03	\$ 1.098.200,59	Certif. Redet. 29/2 Provisorio
				\$ 5.710.501,13		\$ 5.710.501,13	-\$ 285.525,06	\$ 5.424.976,07	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 4.974.548,10		\$ 4.974.548,10	-\$ 248.727,41	\$ 4.725.820,70	Certif. Redet. 30/1 Provisorio
\$ 1.810.693,90				\$ 1.810.693,90		\$ 1.810.693,90	-\$ 90.534,69	\$ 1.720.159,20	Certif. Redet. 30/2 Provisorio
				\$ 1.864.462,64		\$ 1.864.462,64	-\$ 93.223,13	\$ 1.771.239,51	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 1.639.358,89		\$ 1.639.358,89	-\$ 81.967,94	\$ 1.557.390,94	Certif. Redet. 31/1 Provisorio
\$ 598.580,27				\$ 598.580,27		\$ 598.580,27	-\$ 29.929,01	\$ 568.651,26	Certif. Redet. 31/2 Provisorio
				\$ 914.953,63		\$ 914.953,63	-\$ 45.747,68	\$ 869.205,95	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 810.722,47		\$ 810.722,47	-\$ 40.536,12	\$ 770.186,35	Certif. Redet. 32/1 Provisorio
\$ 433.039,02				\$ 433.039,02		\$ 433.039,02	-\$ 21.651,95	\$ 411.387,07	Certif. Redet. 32/2 Provisorio
				\$ 314.398,94		\$ 314.398,94	-\$ 15.719,95	\$ 298.678,99	Certificado de Obra Provisorio
				\$ 276.162,40		\$ 276.162,40	-\$ 13.808,12	\$ 262.354,28	Certif. Redet. 33/1 Provisorio
		\$ 204.197,87		\$ 204.197,87		\$ 204.197,87	-\$ 10.209,89	\$ 193.987,97	Certif. Redet. 33/2 Provisorio
				\$ 178.454,90		\$ 178.454,90	-\$ 8.922,75	\$ 169.532,16	Certificado FINAL de Obra Prov.
	\$ 270.321,84			\$ 270.321,84		\$ 270.321,84	-\$ 13.516,09	\$ 256.805,75	Certif. Redet. 34/1 Provisorio
			\$ 49.700,89	\$ 49.700,89		\$ 49.700,89	-\$ 2.485,04	\$ 47.215,85	Certif. Redet. 34/2 Provisorio
						\$ 9.744.842,48			Devolución Fondos de Reparación
<b>\$ 2.409.274,17</b>	<b>\$ 433.039,02</b>	<b>\$ 474.519,71</b>	<b>\$ 49.700,89</b>	<b>\$ 194.896.849,31</b>		<b>\$ 194.896.849,31</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 185.152.006,64</b>	

M.M.O. PABLO ANGELO VENEZIANO  
 Subdirector Control de Gestión Técnica  
 DiPAI- MISPyH



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería



Santa Fe, 04 de julio de 2022

Expte. 02001-0060875-9

Ref.: nota n° 43917 – pedido de informe sobre  
la obra del nuevo palacio de justicia de Santa  
Fe

Visto lo informado por la Subdirección de  
Control de Gestión Técnica a fs. 5/8, elévense las presentes actuaciones a la Sra.  
Secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Arq. Leticia Battaglia para su conocimiento  
y, por su intermedio, a la Coordinación General de Secretaría Privada del M.I.S.P. y H.

Sirva la presente de atenta nota.-

Arq. ILEANA G. BOSSI SELLY  
DIRECTORA GENERAL  
DIPAI - MISP y H

**"2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"**  
**"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"**

---

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA**  
Francisco Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe – Tel. (342) 4547990  
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) – Rosario – Tel. (341) 4721503  
Mail: [dipai-mop@santafe.gov.ar](mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar)

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería




SANTA FE, 20 de Julio de 2023

Expte. N° 02001 - 0060075 - R

Visto lo solicitado, elévense autos al Subsecretario de Planificación para su conocimiento y evaluación.

Asimismo, se solicita definir prioridades e instruir a esta Dirección Provincial.

Sirva la presente de atenta nota.

  
Arq. HEANA C. ROSSI SELUY  
DIRECTORA PROVINCIAL  
DIPAI - MISPyH

"1983/2023 – 40 años de Democracia"

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
F. Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990  
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503  
dipai-mop@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE  
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas



Santa Fe, 25 de septiembre 2023

Sr.

Secretario Privado (MISPyH)

Andrés DENTESANO

S. / D.

**Ref.:** Expte N° 02001-0060875-9. S/Pedido Informe Obra  
Nuevo Palacio de Justicia de Santa Fe.

Visto lo solicitado oportunamente por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en fs 2, se acompaña Informe Técnico elaborado por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería.

Dicho Informe se refiere exclusivamente a la Obra "Construcción Estructura de Hormigón Armado – Etapa I" y a un Trabajo Complementario correspondiente a esa etapa de la obra. Asimismo, se indica que la segunda etapa denominada "Construcción Anexo Palacio de Justicia" fue licitada por el Poder Judicial, y en la actualidad se encuentra en ejecución bajo la supervisión y financiamiento de dicho organismo.

Finalmente se señala que por motivos de acumulación de trabajos, e inconvenientes sobre una cantidad importante de obras en construcción, se produjo una demora en la elevación del presente informe.

Atentamente.



Ing. OMAR ULISES ROMERO  
SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT  
PROVINCIA DE SANTA FE

**Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas**  
3 de Febrero 2649 Planta Baja (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4506715  
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat



Santa Fe, "Cuna de la Constitución", Septiembre de 2023.-

**Expte:** 02001-0060875-9

**Ref.:** PEDIDO DE INFORME SOBRE LA OBRA DEL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA

Atento a lo solicitado por la Honorable Cámara de Diputados, van las presentes a la **Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos** con la intervención respectiva de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería a fs 5/8

Sirva la presente de atenta nota.

CON. SILVINA FRANK  
Ministra  
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT  
PROVINCIA DE SANTA FE

---

**Secretaría Privada**

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE  
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar



**PROVINCIA DE SANTA FE**  
Ministerio de Gobierno, Justicia y  
Derechos Humanos


NOTA N°: ..... **20017** ..... SANTA FE ..... **25 OCT 2023** .....

**HONORABLE CÁMARA**  
**DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS**  
**DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**

En respuesta a la **Comunicación N° 28171/22** de esa Honorable Cámara remitida por el Poder Ejecutivo, en relación a informe vinculado a la ejecución de la obra del nuevo Palacio de Justicia de Santa Fe.

Se remite **Expediente N° 02001-0060875-9** con las tramitaciones administrativas de las áreas y autoridades competentes, en la cual obra la respuesta a fs. 05 a 11, avalada por la Ministra del área a fs. 12.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

  
Abogada María Susana del Valle  
Ministra del Área de Asuntos Legales,  
Justicia y Derechos Humanos

**Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos - Subsecretaría de Asuntos Legislativos**

Casa de Gobierno - 2° Piso - (S3000DEE) Santa Fe

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"
